


T-RISK-001 | 风险识别、风险登记册与风险应对策略

本专题用于学习"项目风险管理"中连接风险分析与应对的核心内容：风险识别工具、风险登记册（Risk Register）、风险应对策略（规避/转移/减轻/接受/开拓/提高/分享/接受）与残余风险和二次风险。它们不是孤立的策略卡片，而是围绕一个核心问题展开：在识别出不希望发生（或希望发生）的事件后，项目经理应该如何系统地选择应对方案——不只是"出了事再说"，而是在出事之前就做好完整的应对计划？

先看这个专题的主线

风险管理的学习路径是：识别→分析→应对→控制。识别告诉你"有哪些风险"，分析告诉你"哪些最重要、值多少"，应对告诉你"怎么处理"，控制告诉你"后来怎么样了"。

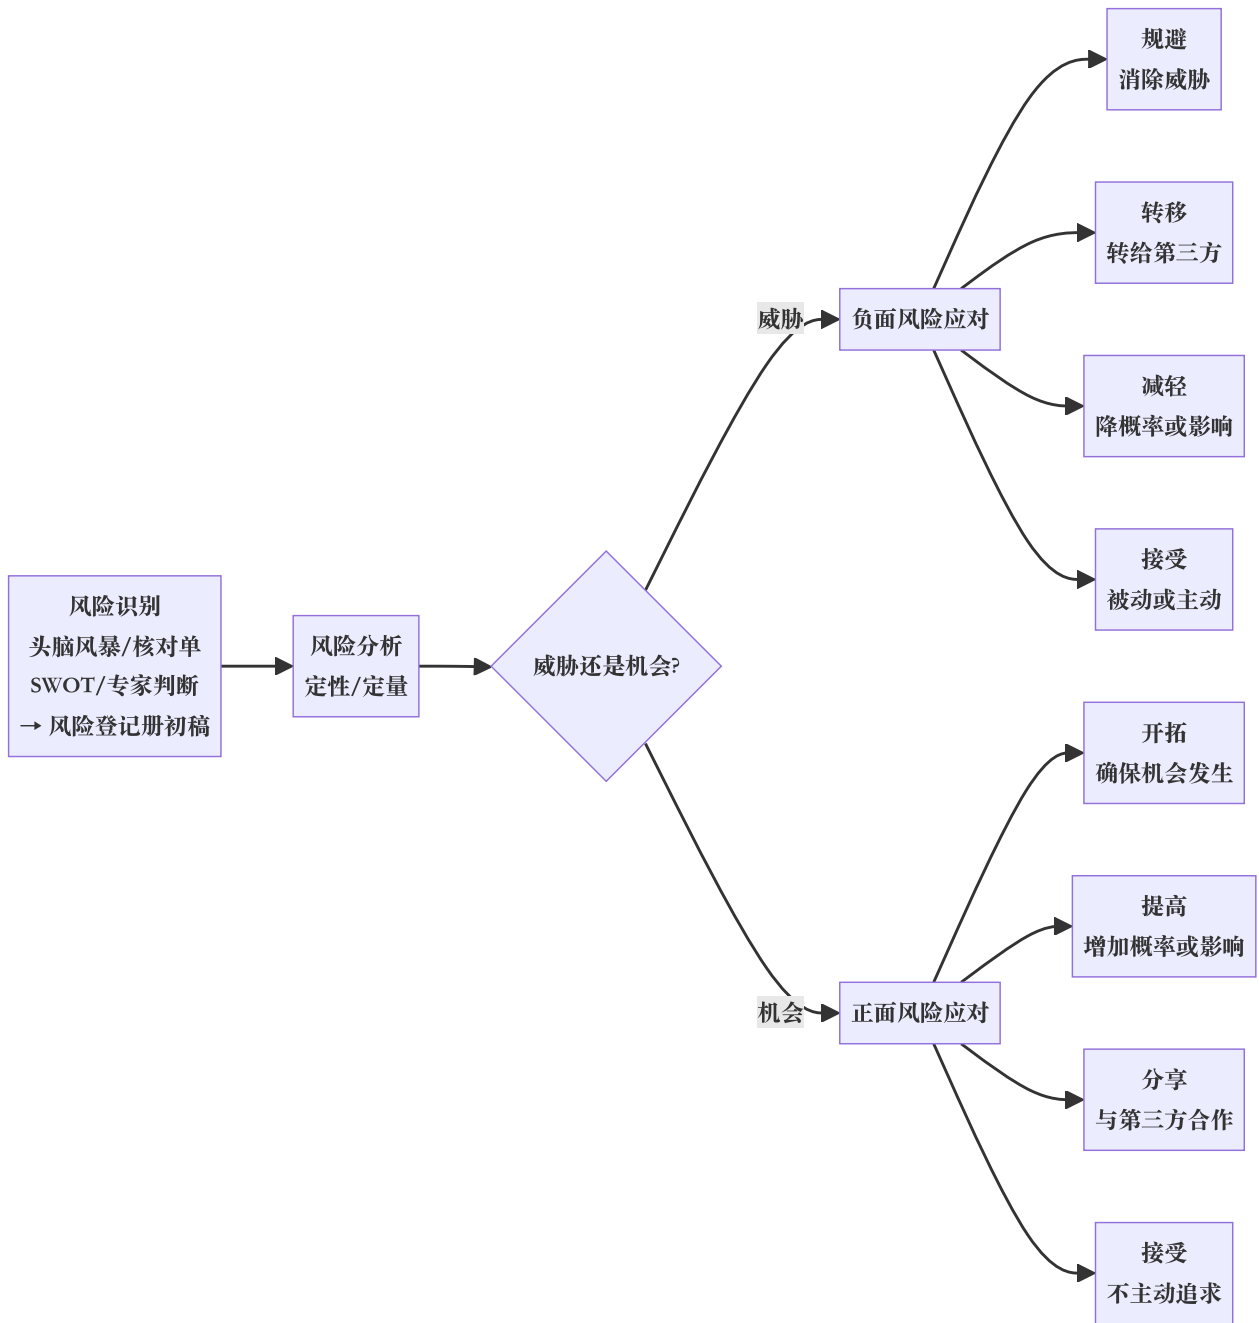

风险识别工具

[概念组 | 主要风险识别工具]

- 头脑风暴：组织团队和专家自由提出风险想法，全面但可能发散
- 核对单（Checklist）：基于历史项目的风险清单逐一对照，快速但可能遗漏新类型风险
- SWOT 分析：从优势、劣势、机会、威胁四个角度识别风险
- 专家判断：邀请有经验的人员识别风险
- 假设分析：检验项目假设的有效性，识别假设不成立时的风险
- 图解技术：因果图（鱼骨图）、系统流程图、影响图

风险识别不是一次性活动——随着项目推进，新的风险不断出现，需要持续更新风险登记册。

风险登记册

[定义 | 风险登记册] 风险登记册是记录已识别风险及其相关信息的核心文件。它至少包含：风险编号、风险描述、概率、影响、优先级、应对策略、责任人、应急计划、触发条件、残余风险。

风险登记册是一个“活的文件”——从风险识别开始建立，在定性分析后补充优先级，在定量分析后补充数值，在应对规划后补充策略和应急计划，在控制过程中持续更新状态。当风险实际发生时，转移到问题日志。

负面风险（威胁）应对策略

[概念组 | 四种威胁应对策略]

1. 规避 (Avoid) : 消除威胁, 使风险不发生。例如: 采用成熟技术替代高风险的新技术; 取消高风险的工作包。这是最彻底的应对方式, 但可能代价高昂。
2. 转移 (Transfer) : 将风险的影响和责任转移给第三方, 但不消除风险本身。例如: 购买保险、外包、使用固定总价合同。需要支付风险溢价 (保费) 。
3. 减轻 (Mitigate) : 降低风险发生的概率或减轻其影响。例如: 增加测试轮次降低缺陷概率; 准备备用方案降低影响。
4. 接受 (Accept) : 不采取主动措施, 在风险发生时再应对。分为被动接受 (不准备预案) 和主动接受 (准备应急储备)。低优先级风险常用接受策略。

[高频辨析 | 转移 vs 规避] 转移是把风险"交给别人承担" (如外包、保险) ——风险本身还在, 只是损失由别人扛。规避是让风险"根本不会发生" (如取消高风险工作)。转移不消除风险, 规避消除风险。

[高频辨析 | 转移 vs 减轻] 转移是换人承担后果 (如买保险后损失由保险公司赔), 减轻是自己降低概率或影响 (如多测试几轮降低缺陷概率)。转移通常涉及合同或保险, 减轻涉及管理措施的加强。

正面风险（机会）应对策略

[概念组 | 四种机会应对策略]

1. 开拓 (Exploit) : 确保机会一定发生。例如: 分配最优秀的人员确保提前完工。
2. 提高 (Enhance) : 增加机会发生的概率或正面影响。例如: 增加资源投入以提前完成。
3. 分享 (Share) : 与第三方合作以抓住机会。例如: 与合作伙伴联合投标。
4. 接受 (Accept) : 不主动追求, 机会自己来了就抓住。

残余风险与二次风险

[概念] 残余风险：采取应对措施后仍然存在的风险。二次风险：因为采取应对措施而引入的新风险。
例如：外包（转移风险）→ 残余风险是外包方可能延误；二次风险是沟通和管理成本增加。

典型题详解与举一反三

例题 1 | 应对策略识别

项目经理决定将项目中一个技术难度最高的模块外包给专业公司。这属于什么风险应对策略？

- A. 规避
- B. 转移
- C. 减轻
- D. 接受

将高风险模块外包 → 风险转移给第三方。正确答案是 B。注意这不是规避——规避是取消高风险工作，外包后工作还在，只是换了执行方。

可制卡点：四种威胁应对策略的关键动作判断卡。

例题 2 | 规避 vs 转移

项目团队原计划使用新技术开发一个关键模块。考虑到技术风险太高，项目经理决定改用成熟技术。这是什么策略？

- A. 规避
- B. 转移
- C. 减轻
- D. 接受

"改用成熟技术"→ 原来的高风险工作被取消了（不再用新技术），风险不复存在 → 规避。正确答案是 A。
如果"仍用新技术但请外部专家指导"→ 那是减轻。

可制卡点：规避（消除风险本身）vs 转移（风险还在但换人扛）辨析卡。

例题 3 | 机会应对

项目比计划进度提前了 2 周。项目经理决定利用这段时间进行额外的性能优化，给客户提供更好的产品体验。这属于什么机会应对策略？

- A. 开拓
- B. 提高
- C. 分享
- D. 接受

利用提前的时间做优化 → 主动扩大正面影响 → 提高。正确答案是 B。如果是“通过安排最优秀的人员来确保提前完工”→ 那是开拓。

可制卡点：四种机会应对策略的关键动作判断卡。

例题 4 | 风险登记册 vs 问题日志

某已识别风险在项目执行中实际发生了。项目经理最应该做什么？

- A. 在风险登记册中更新状态，并转移到问题日志
- B. 删除风险登记册中的该条目
- C. 不做任何处理，因为已经接受了该风险
- D. 关闭风险登记册

已发生的风险应转为问题处理——更新风险登记册状态 + 在问题日志中记录。正确答案是 A。

可制卡点：风险→问题的生命周期卡。

例题 5 | 案例题：风险应对策略选择

某系统集成项目发现关键服务器设备的供应商有 30% 的概率延迟交付 2 个月，影响严重。项目经理考虑三个方案：A. 提前 3 个月下单并支付加急费；B. 在合同中加入延迟罚款条款；C. 多选一家供应商同时供货。请分别判断方案的风险应对策略。

A → 提前下单加急 = 降低延迟概率 → 减轻。B → 合同中罚款条款 = 将财务损失转移给供应商 → 转移。C → 多供应商同时供货 = 降低单一供应商延迟的影响 → 减轻（降低影响）。


延伸理解：同一个风险可以同时采用多种应对策略。B 和 C 的组合（转移+减轻）是实践中常见的做法。

可制卡点：风险应对策略综合判断题卡。

本轮真题覆盖增强：风险识别与风险登记册

本节把 `questions.full.clean.md` 与既有真题映射中的高频考法反查回本专题。2010 上午题考德尔菲技术，案例题常把“已发生的问题”和“未发生风险”混在一起。学习时不要只背定义，要能从题干信号判断它在考哪一个管理动作或技术边界。

这类题的识别链路可以这样看：



图里的重点是“先定位，再排错”。软考选择题常用绝对化说法、角色越权、流程跳步来制造干扰；下午案例题则把同一个错误包装成多句背景，需要把事实翻译回管理过程。

例题 | 风险识别与风险登记册（真题型改编训练题）

德尔菲技术用于风险识别时，主要优点是：

- A. 通过匿名多轮反馈减少个人权威对结果的影响
- B. 精确计算每个风险的货币期望值
- C. 自动生成项目进度网络图
- D. 替代所有专家判断

考查点：风险识别工具、德尔菲技术。

题干关键词：德尔菲、匿名、多轮、减少偏见。

解题过程：德尔菲通过专家匿名反馈和多轮汇总，降低从众、权威和群体压力对识别结果的影响。

正确答案：A。

错项分析：

- B 是定量风险分析中的 EMV 思路。
- C 属于进度网络技术。

- D 德尔菲仍依赖专家判断，只是组织方式更结构化。

举一反三：识别风险时关注“可能发生”；已经发生的延期、缺陷、争议是问题，应进入问题日志并触发应对。

可制卡点：德尔菲技术用途；风险登记册记录什么；风险 vs 问题。

这个专题应该怎样转化为 Anki 卡片

概念卡：七种风险应对策略（威胁 4 + 机会 4 - 重复"接受" $\times 1 = 7$ 种），风险登记册，残余风险，二次风险。

辨析卡：规避 vs 转移（消除风险 vs 换人承担）、减轻 vs 转移（自己降低 vs 换人承担）、开拓 vs 提高（确保发生 vs 增加概率/影响）。

流程卡：风险登记册的生命周期：创建→更新优先级→写入应对策略→跟踪状态→转移至问题日志。

陷阱卡：四种威胁应对策略中，“接受”也分主动接受（有应急储备）和被动接受（没有准备）。

本专题的最小掌握标准

至少能做到：① 识别场景属于哪种风险应对策略（威胁 4 种 + 机会 4 种）；② 区分规避和转移的细微差异；③ 理解风险登记册是活文件，已发生的风险应转移到问题日志；④ 在案例题中给出风险应对策略并说明理由。

待核验与后续改进

- 软考教程中七种应对策略的具体中文术语需与教材核对。[待核验]
