

T-CROSS-001 | 高频跨域概念辨析与易错点

本专题用于集中辨析系统集成项目管理工程师考试中最容易在选择题和案例题中被混淆的高频概念对。这些概念对跨域出现，如果你只背了各自独立的定义，不知道它们在真题中怎么被"调换着问"，就很容易失分。本专题的核心问题是：考试中最容易把哪两个概念调换说法、张冠李戴，怎样练出"一读题就能识别调换"的判断力？

先看这个专题的主线

以下概念辨析按考试频率排列。每个辨析都包含：概念核心、关键区别、常考调换方式、一句话判断口诀。

辨析 1：项目章程 vs 项目管理计划

[高 频] 选择题和案例题中最高频的调换对。


维度	项目章程	项目管理计划
谁发布	发起人（或项目以外的高层）	项目经理领导制定，团队参与
主要作用	正式批准项目存在，授权项目经理动用资源	说明项目将如何执行、监督和控制
内容层级	高层级：项目目标、总体范围、里程碑、关键干系人	详细：各子管理计划 + 三大基准（范围/进度/成本）
生成时间	项目最早，启动过程组	规划过程组，章程之后
是否可轻易修改	通常不轻易修改，重大变化需发起人批准	可通过变更控制流程修改

[陷阱提示] 题目如果说"项目经理批准了项目章程"——错，章程由发起人批准或发布。题目如果说"项目管理计划由发起人编写"——错，由项目经理领导团队编写。

一句话判断：章程 = 出生证（授权项目存在），管理计划 = 操作手册（怎么做项目）。

辨析 2：确认范围 vs 控制质量 vs 控制范围

[高 频] 三者都属于监控过程组，极易混淆。

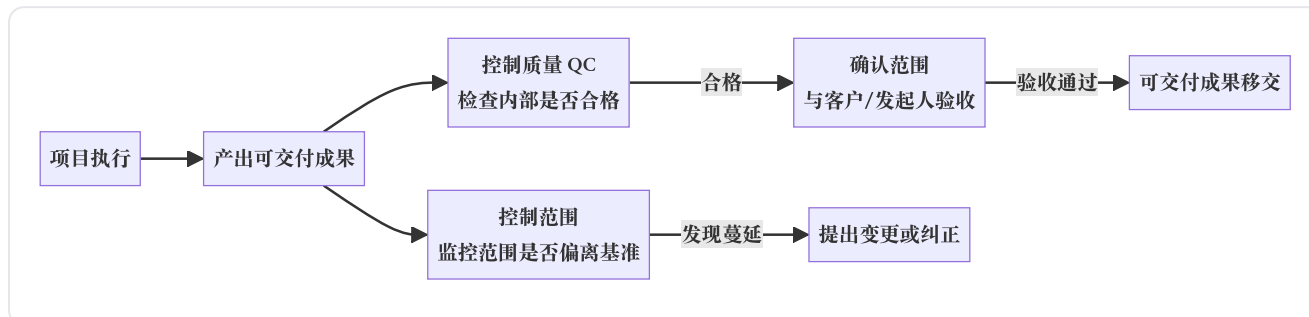

控制质量（QC）：面向内部，检查可交付成果是否满足质量要求。主要是项目团队做的事——测试、检查、测量。

确认范围：面向外部（客户/发起人），由客户/发起人正式验收可交付成果。关注的是"交付物是否是约定要做的"（范围正确性），而不是"交付物有没有缺陷"（质量正确性）。

控制范围：不是验收，而是持续监控范围基准是否被遵守。如果发现有人在没有变更审批的情况下增加或遗漏工作，就是控制范围要处理的问题。

[陷阱提示] 题目说"项目经理组织团队检查可交付成果是否满足质量标准"→ 控制质量（QC），不是确认范围。题目说"邀请客户来验收项目成果"→ 确认范围。题目说"发现项目做了范围外的工作"→ 控制范围。

一句话判断：QC = 内部检查"好不好"，确认范围 = 客户验收"对不对"，控制范围 = 监控"有没有多干或少干"。

辨析 3：质量保证（QA）vs 质量控制（QC）

[高 频] 参见 T-QUAL-001 专题的详细讲解。

QA（质量保证）：关注过程是否可靠。手段：质量审计、过程分析。所属过程组：执行。

QC（质量控制）：关注结果是否合格。手段：测量、测试、检查。所属过程组：监控。

[陷阱提示] 题目说"质量审计发现流程不符合标准"→ QA 活动，不是 QC。

一句话判断：QA 问"做法对不对"，QC 问"东西好不好"。

辨析 4：赶工 vs 快速跟进 vs 资源平衡

[高 频] 参见 T007 专题的详细讲解。

方法	核心动作	主要代价	关键词
赶工	增加资源/加班	成本增加	"加人""加班""加资源""增加投入"
快速跟进	活动并行/重叠	风险增加、返工	"并行""重叠""同时做""未完成就提前开始"
资源平衡	调整活动时间以适应资源限制	工期可能延长	"资源冲突""资源过度分配""同一资源被多用"

一句话判断：赶工 = 加资源，快速跟进 = 改逻辑（并行），资源平衡 = 迁就资源（可能延长工期）。

辨析 5：配置管理 vs 变更管理

[高 频] 参见 T-INT-004 专题的详细讲解。

配置管理：关注交付物和文档的"身份"和"状态"。包括配置项识别、基线建立、版本控制、配置状态报告、配置审计。

变更管理：关注"是否允许改变"。包括变更请求、影响分析、CCB 审批、变更实施、结果验证、文件更新。

[陷阱提示] "版本控制和基线建立"→ 配置管理（不是变更管理）。"提交变更请求给 CCB 审批"→ 变更管理。

一句话判断：配置管"是什么、什么状态"，变更管"改不改、怎么批"。

辨析 6：纠正措施 vs 预防措施 vs 缺陷补救

[中 频] 参见 T-INT-004 专题的变更请求分类。

- **纠正措施**：使项目绩效和计划重新一致（事后纠偏，针对过程）
- **预防措施**：确保未来绩效符合计划（事前预防，针对过程）
- **缺陷补救**：修复不符合要求的产品组件（针对产品）

一句话判断：纠正 = “偏了拉回来”，预防 = “还没偏先堵住”，缺陷补救 = “产品坏了修好”。

辨析 7：风险登记册 vs 问题日志

- **风险登记册**：记录的是未来的、可能发生但尚未发生的事件（风险 = 不确定性）。
- **问题日志**：记录的是已经发生的、正在影响项目的事件（问题 = 已发生的风险或新出现的确定性问题）。

[陷阱提示] 如果一个风险“已经发生”了，它应该从风险登记册转移到问题日志。如果题目说“某个风险已经发生，项目经理仍只在风险登记册中更新”——这是不够的，应该同时更新问题日志。

辨析 8：管理收尾 vs 合同收尾

- **管理收尾（行政收尾）**：项目或阶段结束时的全面收尾活动。包括验收可交付成果、总结经验教训、归档项目文件、释放资源。
- **合同收尾**：仅针对合同的收尾活动。包括确认合同条款已满足、完成合同结算、更新合同记录。

[陷阱提示] 合同收尾发生在管理收尾之前。每个合同都要单独做合同收尾，但管理收尾只做一次（除非多阶段）。

辨析 9：工作绩效数据 vs 工作绩效信息 vs 工作绩效报告

[中 频]

- **工作绩效数据（Data）**：原始观察和测量值，未经加工。如“本周完成了 3 个功能模块的编码”。
- **工作绩效信息（Information）**：对绩效数据进行加工分析后的结果，与计划做比较。如“根据挣值分析， $SV = -8$ 万元，进度滞后”。

- **工作绩效报告 (Report)**：将工作绩效信息汇编成正式的、面向干系人的报告。如"项目月度绩效报告"。

一句话判断：数据 = 原始读数，信息 = 比较分析结果，报告 = 正式文档。

典型题详解

例题 1 | 章程 vs 管理计划

以下哪项是项目章程的内容？

- A. 详细的 WBS
- B. 成本绩效基准
- C. 任命项目经理并授权
- D. 风险应对计划

A、B、D 都属于项目管理计划的内容（或子组件）。C 是章程的核心内容之一——批准项目存在并授权项目经理。正确答案是 C。

例题 2 | 确认范围 vs 质量控制

项目团队完成了所有模块的集成测试，测试报告显示所有功能正常。项目经理接下来应该：

- A. 直接交付客户使用
- B. 组织正式的范围确认，邀请客户验收
- C. 再进行一轮控制质量检查
- D. 更新风险登记册

测试通过（QC 完成）后，应该进行确认范围——邀请客户/发起人正式验收。正确答案是 B。

例题 3 | 管理收尾 vs 合同收尾的顺序

项目进入收尾阶段，以下哪个顺序是正确的？

- A. 管理收尾 → 合同收尾
- B. 合同收尾 → 管理收尾
- C. 两者同时进行
- D. 由项目规模决定顺序

合同收尾（结算每个合同）在先，管理收尾（全面关闭项目）在后。先结清每个合同，再关闭整个项目。正确答案是 B。

例题 4 | 风险 vs 问题

某已识别风险的概率在持续升高，但尚未发生。该项目经理在风险登记册中更新了概率评分，提高了应急储备额度。这种做法：

- A. 错误，风险一旦变化就应该移到问题日志
- B. 正确，风险尚未发生，应继续在风险登记册中跟踪
- C. 错误，应该直接进入风险应对
- D. 正确，但不需要调整应急储备

风险尚未发生，只是在变化（概率升高），应该继续在风险登记册中跟踪和更新。同时调整应急储备是合理的。正确答案是 B。

本轮真题覆盖增强：跨域易混概念反查

本节把 `questions.full.clean.md` 与既有真题映射中的高频考法反查回本专题。真题喜欢把一个题干同时挂到范围、质量、变更、配置、风险等多个域，跨域辨析用于避免答偏。学习时不要只背定义，要能从题干信号判断它在考哪一个管理动作或技术边界。

这类题的识别链路可以这样看：

题干信号 → 定位考点 → 排除绝对化/越界选项 → 写出管理理由 → 沉淀为 Anki 卡点

图里的重点是“先定位，再排错”。软考选择题常用绝对化说法、角色越权、流程跳步来制造干扰；下午案例题则把同一个错误包装成多句背景，需要把事实翻译回管理过程。

例题 | 跨域易混概念反查（真题型改编训练题）

“测试通过的可交付成果”和“客户正式验收的可交付成果”之间最关键的区别是：

- A. 前者偏质量控制，后者偏确认范围
- B. 前者偏合同收尾，后者偏风险识别
- C. 两者完全等同
- D. 前者一定不需要记录

考查点：跨域辨析、质量控制 vs 确认范围。

题干关键词：测试通过、客户验收、可交付成果。

解题过程：质量控制先检查成果是否符合质量要求，确认范围再由客户/发起人正式接受成果。

正确答案：A。

错项分析：

- B 合同收尾可能在验收后发生，但不是这组概念的核心区别。
- C 忽略了内部核实和外部接受的边界。
- D 质量记录同样重要。

举一反三：跨域题先问“谁在做、对象是什么、输出给谁、是否改变基准”，通常能把相似概念分开。

可制卡点：QC vs 确认范围；风险 vs 问题；变更控制 vs 配置控制。

这个专题应该怎样转化为 Anki 卡片

本专题天然适合做辨析卡和陷阱卡。

辨析卡要设计成“双向”的：正面给一个概念描述，背面答它对应哪个概念（而不是另一个易混淆概念）。例如：“项目经理组织团队检查可交付成果是否满足技术规格——这是确认范围还是控制质量？”

陷阱卡记录最常见的“调换出题方式”。例如：“题目说‘项目经理批准了项目章程’——对吗？”答：“不对，章程由发起人批准。”

每对辨析建议做 2-3 张卡：一张正面的定义区分卡，一张场景判断卡，一张陷阱识别卡。

本专题的最小掌握标准

学完本专题后，你至少应该能做到三件事。

第一，对以上 9 对高频易混概念，能不看笔记说出每对概念的核心区别和一句话判断口诀。第二，在选择题中，能一眼识别"把 A 的说法安在 B 头上"的典型陷阱。第三，在案例题中，不会把"确认范围"写成"质量控制"，不会把"变更管理"写成"配置管理"，不会把"纠正措施"写成"预防措施"。

待核验与后续改进

- 建议结合自己的错题记录，在本专题基础上扩展个性化的易混卡片。
- 部分辨析的教材术语可能与 PMBOK 有细微差异，考前以教材为准。[待核验]
