

③ 以往项目中与组织结构有关的经验教训、以前项目中使用的组织形式与历时信息;

④ 团队和项目执行组织内用于解决问题的升级程序。

11.2.3 编制项目人力资源管理计划的输出

1. 项目人力资源管理计划

项目的人力资源管理计划是项目整体管理计划的一个分计划,为项目应该使用什么样的人员、如何配备、如何管理、如何控制、最终又如何释放人力资源提供了指南。

人力资源管理计划及其后续修订,也是制定新版项目管理计划过程的输入。

人力资源管理计划应该包括但不限于如下内容:

1) 角色和职责的分配

项目的角色(谁)和职责(做什么)必须落实到合适的项目相关人员。角色和职责可能会随时间而改变。大多数角色和职责将分配给积极参与项目工作的有关人员,例如项目经理、项目管理小组的其他成员,以及为项目做出贡献的个人。当你要找出那些完成项目所需要的角色和职责时,必须考虑到以下几点。

(1) 角色:指某人负责的项目某部分工作的标识,例如项目管理师、业务分析员、架构师、网络工程师、软件工程师和测试工程师。角色的明确性如(职权、职责和边界)对于项目成功至关重要。

(2) 职权:这里的职权是指使用项目资源、做出决策和批准的权力。需要明确的职权来做决策的例子包括:实施方法的选择、质量接受水平以及如何对项目进行中的偏差做出反应。当团队成员的权力和他们的职责匹配的时候,他们能做得最好。

(3) 职责:指为了完成项目,要求项目团队成员执行的工作。

(4) 能力:完成项目活动所需要的技能。如果项目团队成员不具备完成项目活动所必需的能力,那么绩效将受影响。当发现岗位职责与能力之间存在某种程度的不匹配时,就必须采取提前的应对措施如培训、招聘人员或变更项目范围。

2) 项目的组织结构图

组织结构图用图形表示项目汇报关系(组织管理关系)。它可以是正式的或者非正式的、详尽的或者粗略的描述,但是关系一定要清晰,这要依项目的实际情况而定。例如,一个跨越 3 省的 30 万人的抗震救灾团队的组织结构图应该比 20 个人的内部项目的组织结构图要复杂得多。

3) 人员配备管理计划

人员配备管理计划是项目人力资源管理计划的一部分,描述的是何时、以何种方式、他们需要在项目中工作多久以及怎样满足人力资源需求。根据项目的需要,它可以是正式的或者非正式的,既可以是非常详细的,也可以是比较概略的。为了指导正在进行的团队成员招聘和团队建设活动,人员配备管理计划随着项目的持续进行而经常更新。人

员配备管理计划中的信息随着项目应用领域和规模的不同而不同，但是应该包括如下基本内容。

(1) 人员招募：在计划招聘所需的项目成员时，项目管理团队必须回答很多问题。如所需的人员来自组织内部还是外部？是否有足够多的人员拥有所需的能力或者是仍需培训？项目成员需要在固定地点工作或是远程分散办公？项目所需不同层次的专业技能成本如何？组织的人力资源部门能够提供给项目管理团队什么样的支持？

(2) 资源日历：表明每种具体资源的可用工作日和工作班次的日历。人员配备管理计划说明了项目团队成员（个人或者集体）的时间安排，以及相关的招募活动何时开始。说明人力资源时间表的一种工具是人力资源柱状图。在项目进行的过程中，这种柱状图表示出个人、部门或者团队在每周或者每月需要工作的小时数。人力资源柱状图的竖轴表示某个资源的每周工作的小时数。横轴表示该资源的日历，图中可以加入一条水平线，代表某种资源的使用上限（可以用小时数表示）。超出最大可支配时间的竖条表明需要对该资源进行平衡，如增加更多的资源或者将进度拉长。图 11-3 是一个网络工程师人力资源柱状图的例子。

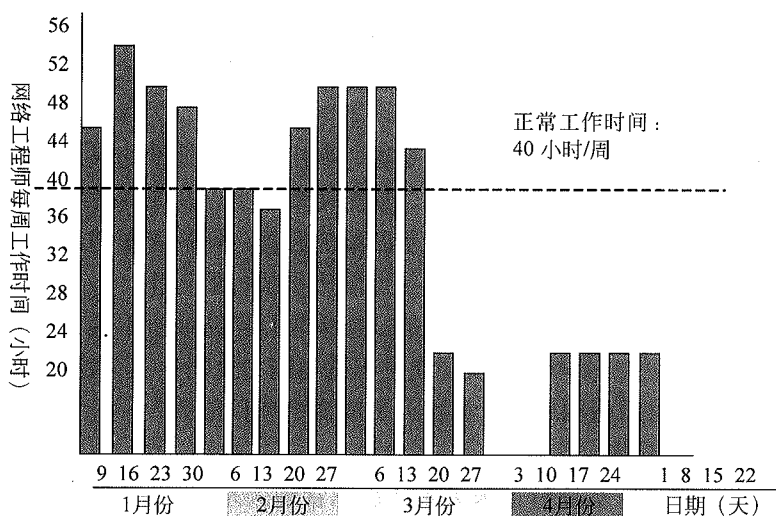


图 11-3 人力资源柱状图

(3) 人员遣散计划：事先确定项目团队成员遣散的时间和方式，对项目组和组员都是有好处的。当已经完成任务的人员在适当的时候离开项目时，我们就不用再从项目经费中为其付人工费，从而降低项目的成本。提前将这些人员平稳地转移到新项目上也可以提高士气。人员遣散计划也有助于减轻项目过程中或项目结束时可能发生的人力资源风险。

(4) 培训需求: 如果计划分配到项目中的人员不具备必需的技能, 就必须制订出一个培训计划。这个计划也可以包含如何协助团队成员获得对项目有益的证书, 从而促进项目的执行。

(5) 表彰和奖励: 明确的奖励标准和完善的奖惩制度将有助于推广和加强那些期望的行为。要想有效, 表彰和奖励必须基于个人负责的活动和绩效。例如某人可以为达到成本目标而受到奖励, 但同时他应该对费用的支出决策有一定程度的控制权。在编制人力资源管理计划时, 制订表彰及奖励计划作为它的一部分。表彰和奖励的实施是团队建设过程的一部分, 最后要确保兑现奖赏。

(6) 遵守的规定: 人员配备管理计划包括一些策略, 以确保遵从相关的政府法律如劳动法、规章、制度、劳动合同或其他的与人力资源相关的法律法规和政策。

(7) 安全性: 针对安全隐患, 为确保项目团队成员的安全而制定的政策和规定, 应该列入人员管理计划和风险清单内。

项目的人力资源管理计划, 为组建项目团队、建设项目团队和管理项目团队提供了指南。

11.3 项目团队组织建设

项目团队组织建设过程包括前后的两个子过程: 首先获取合适的人员以组成团队, 然后建设团队以发挥个人和团队整体的积极性, 从而有力地推进项目的进展。

11.3.1 组建项目团队

组建项目团队过程包括获得所需的人力资源(个人或团队), 将其分配到项目中工作。在大多数情况下, 可能无法得到“最理想”的人力资源, 但项目管理小组必须保证所用的人员能符合项目的要求。

因为集体劳资协议、分包商人员使用、矩阵型项目环境、内外部报告关系或其他各种原因, 项目管理团队不一定对团队成员选择有直接控制权。在组建项目团队过程中, 应特别注意下列事项:

① 项目经理或项目管理团队应该进行有效协商或谈判, 并影响那些能为项目提供所需人力资源的人员。

② 不能获得项目所需的人力资源, 可能影响项目进度、预算、客户满意度、质量和风险。人力资源不足或人员能力不足会降低项目成功的概率, 甚至可能导致项目取消。

③ 如因制约因素(如经济因素或其他项目对资源的占用)而无法获得所需人力资源, 在不违反法律、规章、强制性规定或其他具体标准的前提下, 项目经理或项目团队可能不得不使用替代资源(也许能力较低)。

在项目的计划阶段, 应该对上述因素加以考虑并做出适当安排。

项目经理或项目管理团队应该在项目进度计划、项目预算、项目风险计划、项目质量计划、培训计划及其他相关计划中，说清楚缺少所需人力资源的后果。

1. 组建项目团队的输入

1) 项目人力资源管理计划

在上一节里，我们已经制订了项目的人力资源管理计划。人力资源管理计划里，已经明确指出要完成项目需要什么样的人，以及如何安排和管理他们。人力资源管理计划包含的基本内容如下：

(1) 角色和职责

角色和职责定义了项目需要的人员的类型以及他们的技能和能力。

(2) 项目的组织结构图

组织结构图提供了项目所需人员数量及其汇报关系。

(3) 人员配备管理计划

人员配备管理计划和项目进度一起确定了每个项目团队成员工作时间段，以及有助于项目团队参与的其他重要信息。

2) 事业环境因素

当招募（即获取）人员时，还要考虑事业环境因素，如：

(1) 现有人力资源情况，包括可用性、能力水平、以往经验、对本项目工作的兴趣和成本费率。

(2) 项目实施单位的人事管理政策，如影响外包的政策。

(3) 项目实施单位的组织结构。

(4) 集中办公或多个工作地点。

3) 组织过程资产

参与项目的一个或多个组织可能已有管理员工工作分配的政策、指导方针或过程。这些过程资产可用来帮助人力资源部门和项目负责人招募、招聘或者培训项目团队成员。

2. 组建项目团队的工具和技术

(1) 事先分派

在某些情况下，可以预先将人员分派到项目中。这些情况常常是：由于竞标过程中承诺分派特定人员进行项目工作，或者该项目取决于特定人员的专业技能。

(2) 谈判

人员分派在多数项目中必须通过谈判协商进行。例如项目管理团队可能需要与以下人员协商。

① 负有相应职责的部门经理。目的是确保所需的员工可以在需要的时间到岗并且一直工作到他们的任务完成。

② 项目执行组织中的其他项目管理团队。目的是适当分配稀缺或特殊的人力资源，多个项目都需要这些稀缺的人力资源。

如同组织中关系学的重要性一样,管理团队影响他人的能力在人员分配协商中起着十分重要的作用。例如,一个部门经理在决定把一位各项目都抢着要的出色人才分派给哪个项目时,除考虑项目的重要紧急程度外,也会权衡从项目中能得到哪些回报。

③ 外部组织、卖方、供应商、承包商等。项目经理通过协商谈判获取合适的、稀缺的、特殊的、合格的、经认证的或其他诸如此类的特殊人力资源。特别需要注意与外部谈判有关的政策、惯例、流程、指南、法律及其他标准。

在人员分派谈判中,项目管理团队影响他人的能力很重要,如同在组织中的政治能力一样重要。例如,职能经理在决定把杰出人才分派给哪个项目时,将会权衡各竞争项目的优势和知名度。

(3) 招募

当执行组织缺少内部工作人员去完成这个项目时,就需要从外部获得必要的服务,包括聘用或分包。

(4) 虚拟团队

虚拟团队为团队成员的招募提供了新的途径。虚拟团队可以被定义为有共同目标、在完成各自任务过程中很少有时间或者没有时间能面对面工作的一组人员。现代沟通技术如基于 Internet 的 Email、QQ 群、微信群或视频会议使这种团队成为可能。通过虚拟团队的形式,我们可以:

- ① 在公司内部建立一个由不同地区员工组成的团队。
- ② 为项目团队增加特殊技能的专家,即使这个专家不在本地。
- ③ 把在家办公的员工纳入虚拟团队,以协同工作。
- ④ 由不同班组(早班、中班和夜班)员工组成一个虚拟团队。
- ⑤ 把行动不便或残疾的员工纳入团队。
- ⑥ 可以实施那些原本因为差旅费用过高而被忽略的项目。

虚拟团队也有一些缺点,例如,可能产生误解、有孤立感、团队成员之间难以分享知识和经验、采用通信技术也要花费成本等。

在建立一个虚拟团队时,制订一个可行的沟通计划就显得更加重要。可能需要额外的时间以设定明确的目标,制定方案以处理冲突,召集人员参与决策过程,并与虚拟团队一起通力合作,以使项目成功。

(5) 多维决策分析

在组建项目团队过程中,经常需要使用团队成员选择标准。通过多维决策分析,制定出选择标准,并据此对候选团队成员进行定级或打分。根据各种因素对团队的不同重要性,赋予每种因素不同的权重。例如,可用下列标准对团队成员进行打分:

- ① 可用性。团队成员能否在项目所需时段内为项目工作,在项目期间内是否存在影响可用性的因素。
- ② 成本。聘用团队成员所需的成本是否在规定的预算内。

- ③ 经验。团队成员是否具备项目所需的相关经验。
- ④ 能力。团队成员是否具备项目所需的能力。
- ⑤ 知识。团队成员是否掌握关于客户、类似项目和项目环境细节的相关知识。
- ⑥ 技能。团队成员是否具有相关的技能，来使用项目工具，开展项目执行或培训。
- ⑦ 态度。团队成员能否与他人协同工作，以形成有凝聚力的团队。
- ⑧ 空间等因素。团队成员的位置、时区和沟通能力。

3. 组建项目团队的输出

(1) 项目人员分配表

当适当的人选被分配到项目中并为之工作时，项目人员配置就完成了。依据项目的需要，项目人员可能被分配全职工作、兼职工作或其他各种类型的工作。相关的文档包括：项目成员通信录、备忘录，并将团队成员的名字插入到项目管理计划中（如组织结构图和进度计划）。

(2) 资源日历

资源日历表示出各个阶段到位的项目团队成员可以在项目上工作的时间。要创建一个可靠的、可行的进度计划，这取决于项目成员的时间安排上是否存在冲突（包括要了解员工休假计划，或要了解该员工是否有参与其他项目时间的承诺）。

(3) 可能做出的项目管理计划更新

在组建项目团队过程中可能引起项目管理计划的更新，如人力资源管理计划的更新。

在组建项目团队之前已制定的人力资源管理计划中，虽然项目的角色和职责已由具体的人承担，但是这个具体的人很少能准确满足计划的要求，所以在组建项目团队过程中有时需要在人员管理计划中做相应改变。另一些需要改变人员管理计划的原因包括晋升、退休、生病、绩效问题以及工作强度的变化。

11.3.2 项目团队建设

项目团队建设工作包括提高项目相关人员的技能、改进团队协作、全面改进项目环境，其目标是提高项目的绩效。项目经理应该去招募、建设、维护、激励、领导、启发项目团队以获得团队的高绩效，并达到项目的目标。

1. 项目团队建设的主要目标

在项目的整个生命周期，项目团队建设过程需要项目团队之间建立清晰、及时和有效的沟通。项目团队建设的目标包括但不限于如下目标。

- (1) 提高项目团队成员的个人技能，以提高他们完成项目活动的的能力，与此同时降低成本、缩短工期、改进质量并提高绩效。
- (2) 提高项目团队成员之间的信任感和凝聚力，以提高士气，降低冲突，促进团队合作。

(3) 创建动态的、团结合作的团队文化,以促进个人与团队的生产率、团队精神和团队协作,鼓励团队成员之间交叉培训和切磋以共享经验和知识。

有效的团队合作包括在工作负担不平衡的情况下,互相帮助。以符合各自偏好的方式进行交流,共享信息和资源。如果能够尽早进行团队建设,将会越早收效。当然,这个活动应该贯穿整个项目的生命周期。

2. 成功的项目团队的特点

成功的团队具有如下的共同特点。

- (1) 团队的目标明确,成员清楚自己的工作对目标的贡献。
- (2) 团队的组织结构清晰,岗位明确。
- (3) 有成文或习惯的工作流程和方法,而且流程简明有效。
- (4) 项目经理对团队成员有明确的考核和评价标准,工作结果公正公开、赏罚分明。
- (5) 共同制订并遵守的组织纪律。
- (6) 协同工作,也就是一个成员工作需要依赖于另一个成员的结果,善于总结和学习。

足球场上的球队就是一个典型的团队,各个球员职责分明,各司其职,互相配合,以进球获胜为团队的最高目标,大家为这个共同的目标而奋斗。在激烈的比赛过程中,队形难免会变形,此时邻近的其他队员应及时补位,有队员攻进了球,既是该球员个人积极性充分发挥的结果,也是团队通力配合的结果。

3. 项目团队建设的5个阶段

作为一个持续不断的过程,项目团队建设对项目的成功起着至关重要的作用。在项目的早期,团队建设相对简单,但随着项目的推进,项目团队建设一直在深化。项目环境的改变不可避免,因此团队建设的努力应该不断地进行。项目经理应该持续地监控团队的工作与绩效,以确定为预防或纠正团队问题采取相应的行动。

有一种关于团队发展的模型叫塔克曼(Tuckman)阶梯理论,其中包括团队建设通常要经过的五个阶段。尽管这些阶段通常按顺序进行,然而团队有时也会停滞在某个阶段或退回到较早阶段。如果团队成员曾经共事过,项目团队建设也可跳过某个阶段。

优秀的团队不是一蹴而就的,一般要依次经历以下5个阶段。

- (1) 形成阶段(Forming):一个个独立的个体成员转变为团队成员,开始形成共同目标,对未来团队往往有美好的期待。
- (2) 震荡阶段(Storming):团队成员开始执行分配的任务,一般会遇到超出预想的困难,希望被现实打破。个体之间开始争执,互相指责,并且开始怀疑项目经理的能力。
- (3) 规范阶段(Norming):经过一定时间的磨合,团队成员之间相互熟悉和了解,矛盾基本解决,项目经理能够得到团队的认可。
- (4) 发挥阶段(Performing):随着相互之间的配合默契和对项目经理的信任,成员积极工作,努力实现目标。这时集体荣誉感非常强,常将团队换成第一称谓,如“我们

那个组”“我们部门”等，并会努力捍卫团队声誉。

（5）结束阶段（Adjourning）：随着项目的结束，团队也被遣散了。

以上的每个阶段按顺序依次出现，至于每个阶段的长短则取决于团队的结构、规模和项目经理的领导力。

正像本章开篇所说，由于IT行业的高技术、人员年轻和流动性大等特点，所以团队建设非常重要。本来一个企业想得到所需的优秀人才就不容易，把他们组成一个团队协同工作就更难了。自然界中，狮子可以组成一个优秀的捕猎团队，但要把老虎组织成一个优秀的草原捕猎团队则要困难多了。首先给老虎宣传动员团队的重要性，建立合作的文化，然后再进行艰苦的团队建设活动才能完成。

在项目失败的原因中，团队建设不善甚至分裂占相当的比例，所以项目团队的建设在整个项目管理过程中非常重要。

4. 项目团队建设的输入

项目的人力资源管理计划、项目人员分派表和资源日历，为项目团队建设提供了前提和依据。

（1）项目人力资源管理计划

项目人力资源管理计划里，明确了管理项目人力资源的思路，为定义、配备、管理、控制及最终遣散人力资源提供了指南。

项目人力资源管理计划里，还确定了培训策略和团队建设计划。随着项目进展，要不断地对团队的绩效进行评估并结合其他项目团队的管理手段，那么相应的，诸如，奖励、反馈、额外培训和训练活动将加入该计划，使其日趋丰富。

（2）项目人员分派表

项目人员分派表中列出了谁是项目团队成员。有了分派表，项目经理才能进行团队建设。

（3）资源日历

资源日历明确了项目团队成员能够参加团队建设活动的时间段。

5. 项目团队建设的工具与技术

制订项目人力资源管理计划、招募合适的项目成员后，项目经理应努力把他們组成一个团队一起工作来实现项目目标。许多系统集成项目团队中都有不少非常有才能的员工，但是项目的成功不是靠某一个成员的努力，而是靠整个团队的共同努力而达到的。

依据项目人力资源管理计划，我们已知要完成项目需要的员工的类型与数量以及何时进入项目、何时退出项目等信息，通过人员招募等手段组成一个项目团队。在项目进行期间，根据绩效报告中反映的项目完成情况和来自项目外部人员的反馈，再通过使用如下的工具与技术来建设项目团队。

1) 人际关系技能

项目经理综合运用技术的、人际的和理论的技巧去分析形势并恰当地与项目团队沟

通。使用恰当的人际关系技巧能够帮助项目经理团结项目团队,以发挥团队集体的力量。

人际关系技能,有时被称为“软技能”,对于团队建设极为重要。通过了解项目团队成员的感情,预测其行动,了解其后顾之忧,并尽力帮助他们解决问题,项目管理团队可以在很大程度上减少问题的数量,促进合作。在项目管理过程中,影响力、创造力和团队协同等是一笔非常重要的资产。

2) 培训

培训包含所有旨在增进项目团队成员能力、提高团队整体能力的活动。培训可以是正式的或者非正式的。培训方法包括课堂培训、在线培训、计算机辅助培训,或来自其他项目成员的指导、辅导、研讨和案例分析等工作培训。

如果项目团队成员缺乏必要的管理或者技术技能,则必须把这些技能的培养作为项目的一部分,或者采取措施重新安排项目的人员。计划中的培训可以按人员配备管理计划实施;未列入计划中的培训,通过观察和交流以及绩效评估后开展。

3) 团队建设活动

团队建设活动包括专门的行动和个人行动,首要目的是提高团队绩效。许多行动,例如在计划过程中的工作分解结构之类的团体活动,也许不能明确地当作团队建设,但是如果组织有力的话,同样可以增进团队的凝聚力。另外,为平息和处理人际冲突制定基本规则等,其间接结果都可以提高团队绩效。团队建设可以有多种形式,如日常的评审会议中5分钟的议事日程、为了增进关键性项目的相关人员之间的人际关系而设计的专业团队拓展训练等。

鼓励非正式的沟通和活动也是非常重要的,因为它们培养信任,建立良好工作关系的过程中起着很重要的作用。团队建设的策略对于那些借助电子化手段在异地工作的、不能面对面交流的虚拟团队来说尤其重要。

例如,好多公司采用对新员工进行野外生存训练的办法来培养员工的团结和合作能力,再有就是经常组织一些娱乐活动,在大家娱乐放松的同时让大家互相认识了解,并且给团队一个家的感觉。还有的公司让团队参与智力方面的团队建设活动,这样他们能够更好地了解自己、了解他人以及了解如何最有效地进行合作。了解和重视每个人的不同点以便作为一个团队更有效地工作,这是非常重要的。

4) 基本规则

用基本规则对项目团队成员的行为做出明确规定,规定哪些行为是可接受的,哪些是不可接受的。

越早建立清晰的规则,就越能减少误解、提高工作效率。

对诸如行为规范、沟通方式、协同工作、会议礼仪等基本规则进行讨论,有助于项目成员互相了解对方的价值观。规则一旦制定,项目团队所有成员都要责任严格执行。

5) 集中办公

集中办公是指将所有或者几乎所有重要的项目团队成员安排在同一个工作地点,以

增进他们作为一个团队工作的能力。

集中办公，也被称为“紧密矩阵”。

集中可以是暂时性的，如仅在项目的关键阶段，也可贯穿项目的始终。集中办公的办法需要有一个会议室（有时也称作战室、工程指挥部等），拥有电子通信设备，张贴项目进度表，以及其他便利设施，用来加强交流和培养集体感。

尽管集中办公被认为是很好的办法，但虚拟团队的使用也能带来很多好处，例如使用更多熟练资源、降低成本、减少出差、减少搬迁费用，以及拉近团队成员与供应商、客户或其他重要干系人的距离。

6) 认可与奖励

团队建设过程的一部分内容涉及对于积极行为的认可和奖励。关于奖励方法的最初计划，是在人力资源管理计划中确定的。在管理项目团队的过程中，通过绩效考核，以正式的或非正式的方式对成员进行相应的奖励与表彰。

应只奖励那些被认可的、积极的行为。例如，自愿加班以赶上紧张进度的行为应被认可或者奖励；而计划不周、方法不当、效率不高而导致的加班便不在奖励之列。“输-赢”或“零-和”奖励制度，只奖励少数成员，如“月度最佳队员奖”的奖励，将会破坏团队的凝聚力。赢-赢形式的奖励制度，奖励团队成员都可实现的行为，如按时提交进度报告等，则有助于提高项目团队成员的相互支持。

奖励和认可也必须考虑文化差异。例如，在一些鼓励个人主义的文化背景中实施一套适当的团队奖励是十分困难的。

如果人们感受到自己在组织中的价值，并且可以通过获得奖励来体现这种价值，他们就会受到激励。通常金钱是奖励制度中的有形奖励，然而也存在各种同样有效、甚至更加有效的无形奖励。大多数项目团队成员会因得到成长机会、获得成就感及用专业技能迎接新挑战，而受到激励。项目经理应该在整个项目生命周期中尽可能地给予表彰，而不是等到项目完成时。

7) 人事测评工具

人事测评工具，能让项目经理和项目团队了解团队成员的优势和劣势。

有各种可用的工具，如态度调查、细节评估、结构化面谈、能力测试及焦点小组讨论。这些工具有利于增进团队成员间的理解、信任、忠诚和沟通，在整个项目期间不断提高团队成效。

这些工具可帮助项目经理评估团队成员的偏好和愿望、团队成员如何处理和整理信息、团队成员如何制定决策，以及团队成员如何与人打交道的偏好。

6. 项目团队建设的输出

项目团队建设活动后，可以通过评估“团队绩效”来观察绩效是否改进。在团队建设过程中，还可能发现一些人事制度要更新。

1) 团队绩效评估

当一些培训、团队建设、集中办公等措施被实施后,项目管理团队可以进行正式或非正式的团队绩效评估。有效的团队发展策略和运动会提高团队的绩效,提高达成项目目标的可能性。团队效率的评估可以包含以下几方面:

- ① 提高个人技能,可以使专业人员更高效地完成所分配的活动;
- ② 提高团队能力,可以帮助团队更好的共同工作;
- ③ 较低的员工流动率;
- ④ 团队凝聚力的加强,从而使团队成员公开分享信息和经验,并互相帮助,来提高项目绩效。

2) 事业环境因素更新

作为建设项目团队过程的结果,可能需要更新人事管理制度、员工培训记录和技能评估等事业环境因素。

7. 项目团队绩效评估的主要内容和作用

随着团队建设如培训、团队建设和集中办公等措施的实施,项目管理团队可以进行正式或非正式的团队绩效评估。有效的团队建设方法和运动会提高团队的绩效,因而提高实现项目目标的可能性。团队效率的评估可以包含以下几个指标。

- ① 技能的改进,从而使某个个人更高效地完成所分派的任务。
- ② 能力和情感方面的改进,从而提高团队能力,帮助团队更好地共同工作。
- ③ 团队成员流动率降低。
- ④ 增加团队的凝聚力。这可以通过团队成员之间共享信息和经验以及互相帮助等方法来全面提高项目的绩效。

作为执行项目团队全面绩效考评的结果,项目管理团队可能会发现为了改进项目的绩效,要进行专门的培训、指导、训练和支持,甚至采取必要的变更。也可能通过绩效评估,为改进绩效需要增加合适的资源。这些资源和建议应当记录在案,并被转达到有关方面。这一点当团队成员是工会会员、或涉及到集体协商、或受合同相应条款的限制、或其他类似的情况时尤为重要。

11.4 项目团队管理

11.4.1 项目团队管理的含义和内容

项目团队管理是指跟踪个人和团队的绩效,提供反馈,解决问题和协调变更,以提高项目的绩效。项目管理团队必须观察团队的行为、管理冲突、解决问题和评估团队成员的绩效。实施项目团队管理后,应将项目人员配备管理计划进行更新,提出变更请求、实现问题的解决,同时为组织绩效评估提供依据,为组织的数据库增加新的经验教训。

在一个矩阵组织中，某个项目成员既向职能部门经理汇报又向项目经理汇报，项目团队的管理就变得很复杂。对这种双重汇报关系的有效管理通常是一个项目成功的关键因素。

11.4.2 项目团队管理的工具与技术

可以通过如下的工具与技术，实现对项目团队的管理。

1. 观察和交谈

观察和交谈用于随时了解团队成员的工作情况和思想状态。项目管理团队监控项目的进展，如完成了哪些可交付成果？让项目成员感到骄傲的成就有哪些？以及人际关系问题等。

如果是虚拟团队，这要求项目管理团队进行更加积极主动的、经常性的沟通，不管是面对面还是以其他合适的方式。

2. 项目绩效评估

在项目实施期间进行绩效评估的目的是澄清角色、责任，从团队成员处得到建设性的反馈，发现一些未知的和未解决的问题，制订个人的培训和训练计划，为将来一段时间制定具体目标。

正式和非正式的项目绩效评估依赖于项目的持续时间、复杂程度、组织政策、劳动合同的要求，以及定期沟通的数量和质量。项目成员需要从其主管那里得到反馈。评估信息的收集也可以采用 360 度反馈的方法，从那些和项目成员交往的人那里得到相关的评估信息。360 度的意思是绩效信息的收集可以来自多个渠道、多个方面，包括上级领导、同级同事和下级同事。

3. 冲突管理

在项目环境中，冲突不可避免。冲突的来源包括资源稀缺、进度优先级排序和个人工作风格差异等。采用团队规则、团队规范及成熟的项目管理实践（如沟通规划和角色定义），可以减少冲突的数量，见 11.4.3 介绍。

4. 人际关系技能

项目经理应该综合运用技术、人际技能来分析形势，并与团队成员有效互动。恰当地使用人际关系技能，可充分发挥全体团队成员的优势。

项目经理最常用的人际关系技能包括领导力、影响力和有效决策。详细介绍见本章最后的“延伸阅读”里的有关内容。

11.4.3 冲突管理

1. 认识冲突

冲突，就是计划与现实之间的矛盾，或人与人之间不同期望之间的矛盾，或人与人之间利益的矛盾。在管理项目过程中，最主要的冲突有 7 种：进度、项目优先级、资源、

技术、管理过程、成本和个人冲突。

在项目的各阶段，冲突的排列依次如下。

- ① 概念阶段：项目优先级冲突、管理过程冲突、进度冲突。
- ② 计划阶段：项目优先级冲突、进度冲突、管理过程冲突。
- ③ 执行阶段：进度冲突、技术冲突、资源冲突。
- ④ 收尾阶段：进度冲突、资源冲突、个人冲突。

团队的基本规则、组织原则、基本标准，以及可行的项目管理经验如制订项目沟通计划、明确定义角色与岗位，都有助于减少冲突。

成功的冲突管理可以大大地提高生产力并促进积极的工作关系。如果冲突得以适当的管理，意见的分歧是有益的，可以增加创造力和做出更好的决策。当分歧变成负面因素时，项目团队成员应负责解决他们相互之间的冲突。如果冲突升级，项目经理应帮助团队找出一个满意的解决方案。

项目冲突应该被尽早发现，利用私下但直接的、合作的方式来处理冲突。如果冲突持续分裂，那么需要使用正式的处理过程，包括采取惩戒措施。

当在一个团队的环境下处理冲突时，项目经理应该认识到冲突的下列特点。

- ① 冲突是自然的，而且要找出一个解决办法。
- ② 冲突是一个团队问题，而不是某人的个人问题。
- ③ 应公开地处理冲突。
- ④ 冲突的解决应聚焦在问题，而不是人身攻击。
- ⑤ 冲突的解决应聚焦在现在，而不是过去。

2. 冲突的根源

在项目管理环境里，冲突是不可避免的。冲突的根源包括对稀缺资源的争抢、进度优先级的不同以及每个人不同的工作方式与风格。除此之外，冲突的根源还有如下因素。

(1) 项目的高压环境。项目有明确的开始和结束时间、有限的预算、严格的质量标准等。这些目标相互约束甚至冲突，都会造成项目的紧张和高压环境。

(2) 责任模糊。在多数项目尤其是弱矩阵结构中，项目经理有很小的权力却承担着很大的责任。责任不清或权力责任失衡都会产生冲突。

(3) 存在多个上级。矩阵结构或职能型结构里的项目团队成员来源于职能部门，项目经理在获取人员的时候要和其他项目团队谈判协商以获得内部资源，这样就存在项目中的多重汇报关系，一个成员向多个上级负责，往往会引发冲突。

(4) 新科技的使用。系统集成行业的一个特点就是技术发展快，以至于出现比项目现行使用技术更新的技术，造成大家对各种技术的不同态度和观点，进而引起冲突。

3. 关于冲突的解决

1) 影响冲突解决的因素

在管理项目团队时，项目经理的成功主要依靠他们解决冲突的能力，不同的项目经理解决冲突有不同的风格。影响冲突解决的因素如下。

- ① 冲突的重要性与强度。
- ② 解决冲突的时间压力。
- ③ 涉及冲突各方的位置。
- ④ 基于长期解决冲突还是短期解决冲突的动机。

2) 冲突的解决方法

不管冲突对项目的影晌是正面的还是负面的，项目经理都有责任处理它，以减少冲突对项目的不利影响，增加其对项目积极有利的一面。

以下是冲突管理的6种方法。

(1) 问题解决 (Problem Solving / Confrontation)。问题解决就是冲突各方一起积极地定义问题、收集问题的信息、制定解决方案，最后直到选择一个最合适的方案来解决冲突，此时为双赢或多赢。但在这个过程中，需要公开地协商，这是冲突管理中最理想的一种方法。

(2) 合作 (Collaborating)。集合多方的观点和意见，得出一个多数人接受和承诺的冲突解决方案。

(3) 强制 (Forcing)。强制就是以牺牲其他各方的观点为代价，强制采纳一方的观点。一般只适用于赢-输这样的零-和游戏情景里。

(4) 妥协 (Compromising)。妥协就是冲突的各方协商并且寻找一种能够使冲突各方都有一定程度满意、但冲突各方没有任何一方完全满意、是一种都做一些让步的冲突解决方法。

(5) 求同存异 (Smoothing/Accommodating)。求同存异的方法就是冲突各方都关注他们一致的一面，而淡化不一致的一面。一般求同存异要求保持一种友好的气氛，但是回避了解决冲突的根源。也就是让大家都冷静下来，先把工作做完。

(6) 撤退 (Withdrawing/Avoiding)。撤退就是把眼前的或潜在的冲突搁置起来，从冲突中撤退。

11.4.4 项目团队管理的输入、输出

1. 项目团队管理的输入

要对项目团队的日常工作进行监督管理，得先准备好项目的人力资源管理计划、项目人员分派表、团队的绩效评估、问题日志以及组织过程资产。

(1) 项目人力资源管理计划

项目人力资源管理计划，为包括项目团队管理在内的各个人力资源管理过程提供了

指南, 该计划包括但不限于如下内容:

- ① 角色和职责。包含了参加项目的、每一个员工的角色和职责清单;
- ② 项目的组织结构图。提供了项目团队成员的汇报关系图;
- ③ 人员配备管理计划。列出了团队成员在项目中的工作周期, 同时也包括培训计划、资格要求, 以及与某些规章制度的一致性问题。

(2) 项目人员分派表

在管理项目团队这个监控过程中, 项目人员分派表为项目团队成员的评估提供了一个人员清单。

(3) 团队绩效评估

项目管理团队可以持续地进行正式或非正式的项目团队绩效评估。依据对项目团队绩效的持续评估, 可以采取行动解决问题、改进沟通、处理冲突以及改进团队合作。

(4) 问题日志

在管理项目团队过程中, 经常出现各种问题, 把这些问题记录在问题日志里, 在问题日志里还要记录由谁负责在目标日期内解决特定问题, 也使用问题日志来跟踪监督问题的解决情况。

(5) 绩效报告

在工作绩效报告里, 通过比较当前项目状态与预期项目状态, 全面记录项目的监控结果, 包括进度控制、成本控制、质量控制和范围核实的结果。绩效报告中的信息和预测可以确定未来对人力资源的需求、对团队成员的奖励与表彰以及对人员配备计划的更新。

(6) 组织文化和组织过程资产

影响管理项目团队过程的组织文化和组织过程资产包括但不限于如下内容:

- ① 感谢信、庆功宴;
- ② 时事通信、公告牌等项目新闻报道;
- ③ 网站;
- ④ 奖金结构;
- ⑤ 员工着装;
- ⑥ 其他组织津贴。

项目管理团队应该利用组织的政策、流程 and 规定来为员工在项目进行过程中提供奖励。

2. 项目团队管理的输出

通过对项目团队的日常监督管理, 不仅解决人员冲突问题, 也维持了项目的较高绩效。在这个过程中, 也可能要处理变更、更新项目文件。

1) 变更请求

项目成员的变更, 无论是不是受控事件, 都会影响到未来的项目计划。在项目经理

权限之内的变更，由项目经理负责解决。当项目成员的变更干扰了项目整体计划时，例如引起进度的延期或预算的超支，那么将利用组织的整体变更控制过程处理该项变更请求。员工的变更包括任务变动、部分工作外包以及替代已离职员工。

应该采取预防措施以降低这些变动对项目的不利影响，例如针对员工的离职等行为可采取交叉培训措施，及时识别出新增的岗位和角色，以及及时增加员工的工作时间，以完成项目的所有任务。

2) 已更新的项目管理计划

项目管理计划的有关部分、有关的分计划如人员配备管理计划，在管理项目团队的过程中可能得到更新。就人员配备管理计划来说，伴随着项目的进展，项目管理团队必须要采取一些纠正行为调整团队或其成员，这些调整应反映在人员配备管理计划中。人力资源管理的纠正行为包括员工的变动、附加的培训和惩罚行为。员工变动可能会要求任务分配的改变、外包一些工作以及由谁来代替已离职的员工。

3) 项目文件更新

在对项目团队的日常工作进行监督管理时，可能被间接更新的项目文件包括但不限于：

- ① 问题日志；
- ② 角色描述；
- ③ 项目人员分派。

4) 事业环境因素更新

管理项目团队时，可能需要更新的事业环境因素包括但不限于：

- ① 对组织绩效评价的输入；
- ② 个人技能更新。

5) 已更新的组织过程资产

作为项目团队管理过程执行的结果，组织过程资产可能需要如下甚至不止如下的更新：

(1) 问题解决

在项目团队管理过程中，不是所有的问题都会有结果，那些被公布和解决的问题应记录在问题日志里；同样，未被解决的问题应记录在遗留问题日志里。

(2) 组织绩效评估输入

项目全体员工应该定期地为组织绩效评估提供输入，为未来项目的绩效提供参考。

(3) 历史信息 and 经验教训文档

在项目执行过程中所有的经验教训都应该被记录，因此它将作为组织历史数据库的一部分。在人力资源方面的经验教训可以包括以下几个部分。

- 以模板形式保存的组织结构图、职位描述和员工管理计划；
- 有特殊用途的团队基本原则、冲突管理技巧和奖罚；

- 被证实非常成功的虚拟团队、集中办公、协商、采购、培训和团队建设过程；
- 在项目执行过程中发现的专业技能。

(4) 组织的标准流程

在管理项目团队的过程中，可能会更新组织的标准流程如人员的招聘、使用、评估考核和辞退流程。

延伸阅读：现代激励理论及项目经理所需具备的影响力

项目团队建设要发挥每个成员的积极性，发扬团队的团结合作精神，提高团队的性能，以使项目成功，这是团队共同的奋斗目标。但是怎么才能发挥每个成员的积极性？怎样建设好一个项目团队呢？团队建设作为项目管理中唯一的一个管人的过程，其理论基础和实践经验大多是从人力资源管理理论、组织行为学借鉴的，下面分别从激励理论、X 理论和 Y 理论、领导与管理、影响与能力等 4 个方面进行介绍。

1. 激励理论

所谓激励，就是如何发挥员工的工作积极性的方法。典型的激励理论有马斯洛需要层次理论、赫茨伯格的双因素理论和期望理论。

1) 马斯洛需要层次理论

著名的心理学家亚伯拉罕·马斯洛（Abraham Maslow）在 1943 年就首先提出了他的需要层次理论并以此闻名。他认为人类行为有着最独特的性质：爱、自尊、归属感、自我表现以及创造力，从而人类能够自己掌握自己的命运。

马斯洛建立了一个需要层次理论，图 11-4 就是该层次理论的基本结构，是一个 5 层的金字塔结构。

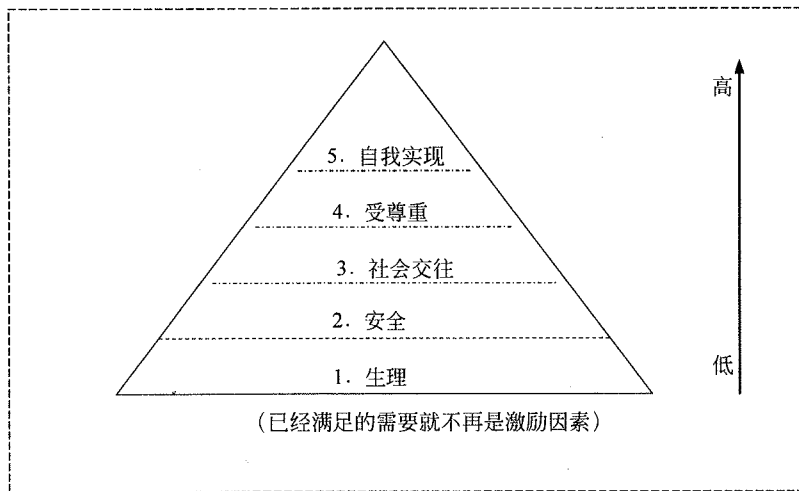


图 11-4 马斯洛的需要层次理论

该理论以金字塔结构的形式表示人们的行为受到一系列需求的引导和刺激，在不同的层次满足不同的需要，才能达到激励的作用。

(1) 生理需要：对衣食住行等需要都是生理需要，这类需要的级别最低，人们在转向较高层次的需要之前，总是尽力满足这类需要。

(2) 安全需要：安全需要包括对人身安全、生活稳定、不致失业以及免遭痛苦、威胁或疾病等的需要。和生理需要一样，在安全需要没有得到满足之前，人们一般不追求更高层的需要。

(3) 社会交往的需要：社会交往（社交）需要包括对友谊、爱情以及隶属关系的需要。当生理需要和安全需要得到满足后，社交需要就会突出出来，进而产生激励作用。这些需要如果得不到满足，就会影响员工的精神，导致高缺勤率、低生产率、对工作不满及情绪低落。

(4) 自尊的需要：指自尊心和荣誉感。

(5) 自我实现的需要：指想获得更大的空间以实现自我发展的需要。

在马斯洛需要层次中，底层的4种需要——即生理、安全、社会、自尊被认为是基本的需要，而自我实现的需要是最高层次的需要。

马斯洛需要层次理论有如下的三个假设：

(1) 人要生存，他的需求能够影响他的行为，只有未被满足的需要能够影响其行为，已得到满足的需要不再影响其行为（也就是：已被满足的需要失去激励作用，只有满足未被满足的需要才能有激励作用）。

(2) 人的需要按重要性从低到高排成金字塔形状。

(3) 当人的某一级的需要得到满足后，才会追求更高一级的需要，如此逐级上升，成为他工作的动机。

项目团队的建设过程中，项目经理需要理解项目团队的每一个成员的需要等级，并据此制订相关的激励措施。例如在生理和安全的需要得到满足的情况下公司的新员工或者新到一个城市工作的员工可能有社会交往的需要。为了满足他们的归属感的需要，有些公司就会专门为这些懂得信息技术的新员工组织一些聚会和社会活动。要注意到不同的人有不同的需要层次和需求种类。

2) 赫茨伯格的双因素理论

激励因素-保健因素理论是美国的行为科学家弗雷德里克·赫茨伯格（Fredrick Herzberg）提出来的，又称双因素理论。双因素理论认为有两种完全不同的因素影响人们的工作行为。

第一类是保健因素（Hygiene Factor），这些因素是与工作环境或条件有关的，能防止人们产生不满意感的一类因素，包括工作环境、工资薪水、公司政策、个人生活、管理监督、人际关系等。当保健因素不健全时，人们就会产生不满意感。但即使保健因素很好时，也仅仅可以消除工作中的不满意，却无法增加人们对工作的满意感，所以这些

因素是无法起到激励作用的。

第二类是激励因素 (Motivator), 这些因素是与员工的工作本身或工作内容有关的、能促使人们产生工作满意感的一类因素, 是高层次的需要, 包括成就、承认、工作本身、责任、发展机会等。当激励因素缺乏时, 人们就会缺乏进取心, 对工作无所谓, 但一旦具备了激励因素, 员工则会感觉到强大的激励力量而产生对工作的满意感, 所以只有这类因素才能真正激励员工。

3) 期望理论

由著名的心理学家和行为科学家维克多·弗罗姆 (Victor Vroom) 于 1964 年在其名著《工作与激励》中首先提出期望理论。期望理论关注的不是人们的需要的类型, 而是人们用来获取报酬的思维方式, 认为当人们预期某一行为能给个人带来预定结果, 且这种结果对个体具有吸引力时, 人们就会采取这一特定行动。

期望理论认为, 一个目标对人的激励程度受两个因素影响。

(1) 目标效价, 指实现该目标对个人有多大价值的主观判断。如果实现该目标对个人来说很有价值, 个人的积极性就高; 反之, 积极性就低。

(2) 期望值, 指个人对实现该目标可能性大小的主观估计。只有个人认为实现该目标的可能性很大, 才会去努力争取实现, 从而在较高程度上发挥目标的激励作用; 如果个人认为实现该目标的可能性很小, 甚至完全没有可能, 目标激励作用则小, 以至完全没有。

2. X 理论和 Y 理论

道格拉斯·麦格雷戈 (Douglas M. McGregor) 是美国著名的行为科学家, 他在 1957 年 11 月提出了 X 理论-Y 理论。X 理论和 Y 理论于人性的假设截然相反。

1) X 理论

X 理论主要体现了独裁型管理者对人性的基本判断, 这种假设认为:

- (1) 一般人天性好逸恶劳, 只要有可能就会逃避工作。
- (2) 人生来就以自我为中心, 漠视组织的要求。
- (3) 人缺乏进取心, 逃避责任, 甘愿听从指挥, 安于现状, 没有创造性。
- (4) 人们通常容易受骗, 易受人煽动。
- (5) 人们天生反对改革。

崇尚 X 理论的领导者认为, 在领导工作中必须对员工采取强制、惩罚和解雇等手段, 强迫员工努力工作, 对员工应当严格监督、控制和管理。在领导行为上应当实行高度控制和集中管理, 在领导风格上采用独裁式的领导方式。

2) Y 理论

Y 理论对人性的假设与 X 理论完全相反, 其主要观点为:

- (1) 一般人天生并不是好逸恶劳, 他们热爱工作, 从工作得到满足感和成就感。
- (2) 外来的控制和处罚对人们实现组织的目标不是一个有效的办法, 下属能够自我

确定目标,自我指挥和自我控制。

(3) 在适当的条件下,人们愿意主动承担责任。

(4) 大多数人具有一定的想象力和创造力。

(5) 在现代社会中,人们的智慧和潜能只是部分地得到了发挥。

基于Y理论对人的认识,信奉Y理论的管理者对员工采取民主型和放任自由型的领导方式,在领导行为上遵循以人为中心的、宽容的及放权的领导原则,使下属目标和组织目标很好地结合起来,为员工的智慧和能力的发挥创造有利的条件。

3) X理论和Y理论的应用

X理论和Y理论的选择决定管理者处理员工关系的方式。迄今为止,无法证明两个理论哪个更有效。实际上,这两个理论各有自己的长处和不足。用X理论可以加强管理,但项目团队成员通常比较被动地工作。用Y理论可以激发员工主动性,但对于员工把握工作而言可能又放任过度。我们在应用的时候应该因人、因项目团队发展的阶段而异。例如,在项目团队的开始阶段,大家互相还不是很熟悉,对项目不是很了解或者还有一种抵触等,这时候需要项目经理运用X理论去指导和管理;当项目团队进入执行阶段的时候,成员对项目的目标已经了解,都愿意努力完成项目,这时候可以用Y理论去授权团队完成所负责的工作,并提供支持和相应的环境。

3. 领导与管理

领导作为名词,指领导人或领导者;作为动词,指领导活动。传统观念认为,领导是指一个人被组织赋予职位和权力,以率领其下属实现组织目标。现代观念认为,领导是一种影响力,是对人们施加影响,从而使人们心甘情愿地为实现组织目标而努力的艺术过程。领导者有责任洞察过程的不确定性,为其负责的组织指引正确的方向,并在必要时引导变革。

领导的能力,简称领导力。成功的项目需要强有力的领导技能。领导力在项目生命周期中的所有阶段都很重要。有多种领导力理论,定义了适用于不同情形或团队的领导风格。领导力对沟通愿景及鼓舞项目团队高效工作十分重要。

管理者是组织依法任命的,负责某个组织或某件事情的管理,是通过调研、计划、组织、实施和控制来实现管理的,以完成更高一层组织交代的任务。

项目经理带领团队管理项目的过程中,具有领导者和管理者的双重身份。越是基层的项目经理,需要的管理能力越强,需要的领导力相对管理能力而言不高。越是高层的项目经理如特大型项目的项目经理,需要的领导力越高,需要的管理能力相对领导力而言不高。

到目前为止,还没有一套公认的领导理论,目前主要有“领导行为理论”和“领导权变理论”。

(1) 领导行为理论的基本观点是:领导者应该知道要做什么和怎样做才能使工作更有效。集中在如下两个方面。

① 领导者关注的重点，是工作的任务绩效，还是搞好人际关系？

② 领导者的决策方式，即下属的参与程度。典型的领导方式有专断型、民主型和放任型。

(2) 领导权变理论的基本观点是：认为不存在一种普遍适用、唯一正确的领导方式，只有结合具体情景，因时、因地、因事、因人制宜的领导方式，才是有效的领导方式。其基本观点可用下式反映：

有效领导 = F (领导者，被领导者，环境)

即有效地领导取决于领导者自身、被领导者与领导过程所处的环境。例如，在项目早期团队组建的过程中，或对于新员工，领导方式可以是专断型（或者说独裁式、指导式）；当团队成员熟悉情况后，可以采用民主型甚至可以部分授权。

4. 影响和能力

人是组织和项目最重要的资产。有的人是直接向项目经理汇报的，有的人是间接向项目经理汇报的，有的人是不向项目经理汇报的。对于直接汇报的人可以用权力来管，那么怎么管理其他类型的人呢？其实项目经理无论管理哪种类型的人，除运用权力等强制力之外，更重要的是运用项目经理的影响力。

(1) 影响力

在矩阵环境中，项目经理对团队成员通常没有或仅有很小的命令职权，所以他们适时影响干系人的能力，对保证项目成功非常关键。影响力主要体现在如下各方面：

- ① 说服别人，以及清晰表达观点和立场的能力；
- ② 积极且有效地倾听；
- ③ 了解并综合考虑各种观点；
- ④ 收集相关且关键的信息，以解决重要问题，维护相互信任，达成一致意见。

(2) 影响员工的方法

泰穆汗和威廉姆对项目经理影响做了研究，影响方法有如下9种。

- ① 权力：发命令的正当等级权力。
- ② 任务分配：项目经理为员工分配工作的能力，让合适的人做合适的事。
- ③ 预算支配：项目经理自由支配项目资金的能力。
- ④ 员工升职：根据员工在项目中的表现提拔员工的能力。
- ⑤ 薪金待遇：根据员工在项目中的表现给员工提高工资和福利待遇的能力。
- ⑥ 实施处罚：根据员工在项目中的不良表现对员工进行处罚的能力。
- ⑦ 工作挑战：根据员工完成一项特定任务的喜好来安排其工作，这将是一个内在的刺激因素。
- ⑧ 专门技术：项目经理所具有的其他人觉得很重要的一些专业技术知识。
- ⑨ 友谊：项目经理和其他人之间建立良好的人际关系的能力。

研究表明，项目经理使用工作挑战和专门技术来激励员工工作往往能取得成功。而

当项目经理使用权力、金钱或处罚时，他们常常会失败。

（3）权力

5种基本的权力分别介绍如下。

① 合法的权力，是指在高级管理层对项目经理正式授权的基础上，项目经理让员工进行工作的权力。

② 强制力，是指用惩罚、威胁或者其他消极手段强迫员工做他们不想做的事。然而，一般强制力在项目团队的建设中不是一个很好的方法，通常会带来项目的失败，建议不要经常使用。

③ 专家权力，与泰穆汗和威廉姆的影响因素中的专门技术类似，就是用个人知识和技能让员工改变他们的行为。如果项目经理让员工感到他在某些领域有专长，那么他们就会遵照项目经理的意见行事。

④ 奖励权力，就是使用一些激励措施来引导员工去工作。奖励包括薪金、职位、认可度、特殊的任务以及其他的奖励员工满意行为的手段。大部分奖励理论认为，一些特定的奖励，如富有挑战性的工作、工作成就以及认可度才能真正引导员工改变行为或者努力工作。

⑤ 感召权力。权力是建立在个人感召权力的基础上。人们非常尊重某些具有感召权力的人，会按照他们所说的去做。

以上是项目经理的5个权力类型，建议项目经理最好用奖励权力和专家权力来影响团队成员去做事，尽量避免强制力。并且项目经理的合法权力、奖励权力和强制力是来自公司的授权，而其他的权力则是来自项目经理本人。

（4）效率

项目经理可以利用史蒂文总结的高效率的人具备的7种习惯来帮助自己和项目组。这7种习惯分别如下。

- ① 保持积极状态。
- ② 从一开始就牢记结果。
- ③ 把最重要的事放在最重要的位置上。
- ④ 考虑双赢。
- ⑤ 首先去理解别人，然后再被别人理解。
- ⑥ 获得协同效应。
- ⑦ “磨快锯子”。

倾听是一个优秀的项目经理必备的关键技能。

（5）有效的决策

有效决策包括谈判能力，以及影响组织与项目管理团队的能力。进行有效决策需要：

- ① 着眼于所要达到的目标;
- ② 遵循决策流程;
- ③ 研究环境因素;
- ④ 分析可用信息;
- ⑤ 提升团队成员个人素质;
- ⑥ 激发团队创造力;
- ⑦ 管理风险。

第 12 章 项目沟通管理和干系人管理

12.1 沟通的基本概念

沟通是人与人进行交流的工具，早期人类的信息传递通过简单的口语和绘画进行，之后发展到文字方式（通过如铭文、锦帛、竹简、书籍、书信等传递信息）。随着人类语言的发展和科技的进步，如今人们的信息交换不仅使用更加复杂的语言和符号，而且沟通的媒介更加丰富，人们可以采用电话系统、网络系统等方式迅速地、大范围地传递信息。对于沟通这样一个重要的工具，人们对它的研究很早就已经开始，如我国春秋、战国时期的纵横家就是利用沟通这一工具达到翻云覆雨，执掌各国政治的目的。

12.1.1 沟通的定义

在管理项目时，沟通是一个过程，是人们分享信息、表达思想和情感的过程，包括信息的生成、传递、接收、理解和检查。项目经理的绝大多数时间都用于与团队成员和其他干系人的沟通，无论这些成员或干系人是来自组织内部（位于组织的各个层级上）还是组织外部。有效的沟通在项目干系人之间架起一座桥梁，把具有不同文化和组织背景、不同技能水平、不同观点和利益的各类干系人联系起来。这些干系人能影响项目的执行或结果。最简单的沟通模型就是一个人与另一个人的信息交换过程，这一过程可以简化为如图 12-1 所示的沟通模型。

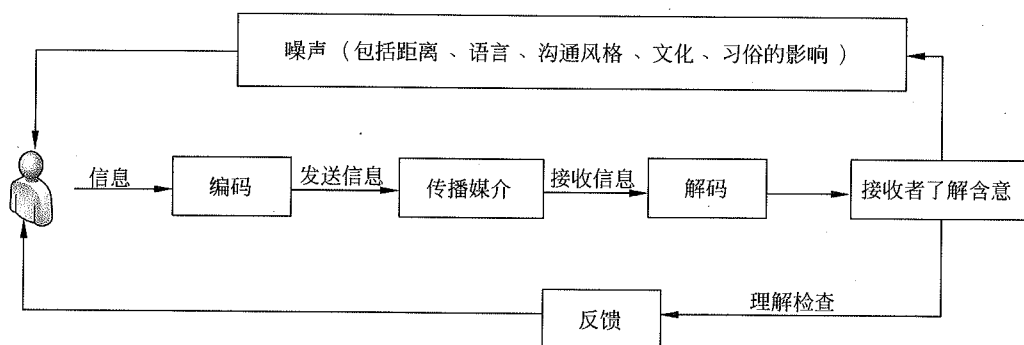


图 12-1 沟通模型

沟通的基本构成如图 12-1 所示。

1) 接收者和发送者

大部分情况下,参与者既发送信息,又接收反馈,是一体的。即信息的所有者在信息发送后希望能够得到相应的反馈。发送-接收方(sender-receivers)可以是个人、团体、企业、政府等。

2) 信息(Message)

信息(Message)是指多个参与者(参与者内心的自省不在此例中)之间需要分享的信息,表达思想和情感的组成物。在沟通过程中,信息的存在方式被定义为符号(Symbol),而符号分为语言符号和非语言符号两种。语言符号是用来描述具体实物的具体符号(Concrete Symbol),如“桌子”。也可以是用来描述表达某种思想和情感的抽象符号(Abstract Symbol),如“崇拜”。非语言符号(Nonverbal symbol)是指除语言符号之外的其他符号,比如在沟通过程中所产生的表情、姿势、语音、语气、语调、着装等,也同样在沟通的过程中传递着某些信息。

3) 渠道

渠道(Channel)是指信息在参与者之间进行传递的途径,有的时候又被称为通道、媒介。要想达到沟通的目的,渠道的选择是非常重要的,需要沟通的参与者根据需要进行选择和决定。沟通的形式可以是口头的或者书面的,详细的或简略的,正式的或非正式的,在进行沟通时,参与者需要认真选择适合的沟通形式。有些信息,通过非正式面对面闲谈进行沟通比较合适;某些信息,通过纸质方式以文件的形式进行正式沟通比较合适;某些信息,通过采用正式会议的方式进行沟通比较合适。

沟通的参与者在沟通的过程中,由于参与者的数量不同,潜在的沟通渠道数量计算公式如下:

$$M = n * (n - 1) / 2, \quad \text{其中 } n \geq 1$$

当 $n=1$ 时,即参与者与自身进行沟通, $M=0$ 。

当 $n=2$ 时,也就是参与者有2人,即2个人面对面的交流, $M=1$ 。

当 $n>2$ 时,也就是参与者众多的环境,多人之间可能发生通过不同的渠道进行沟通,例如,当参与者 $n=9$ 时,沟通渠道数量 $M=36$ 条;当参与者 $n=10$ 时,沟通渠道的数量 $M=45$ 条。可以看出,增加一个参与者,就增加了9条潜在的沟通渠道。

可以看出,随着参与者的增加,沟通渠道的数量显著增加,增大了沟通成本。在进行沟通的时候,沟通规模的大小,参与者数量的多少,项目管理者应认真权衡。

(1) 反馈

反馈(Feedback)是参与者之间针对信息的反应过程。根据沟通的需要、参与者的意愿以及能力、其他限制条件等因素的影响,参与者需要选择不同程度的反馈。选择不同的反馈,达到的效果也不同。参与者采用进行面对面的交谈方式,反馈就是及时、迅速的;远程的参与者通过信件进行交流时,反馈就是相对较慢的;利用邮件、传真等交流方式时,反馈的速度是不确定的。

(2) 噪音

凡是发生在参与者之间，能够干扰和阻碍理解和解释信息的因素，都是噪音(Noise)。噪音的存在有三种不同的形式：① 外部噪音。主要来自于沟通环境。比如参与者在—个嘈杂的环境中进行交谈、其他人说话的声音、广播音响、汽车发动机的声音等等都属于此类；② 内部噪音。来自于参与者的头脑中，比如上课走神的学生，对人工智能有着排斥心理的企业工人等都属于此类；③ 语义噪音。在不同文化背景、不同语言背景、不同宗教背景或不同阶层背景的人之间经常产生不利于理解沟通的情况。比如，不合时宜的低劣笑话，引入性别歧视、宗教纷争、政治观点等话题时，可能会引起不必要的沟通障碍。

(3) 环境

环境(Environm—ent)就是以上因素的全部活动背景。不同的沟通所需要的沟通环境也是不同的，参与者要谨慎和仔细地选择适合的沟通环境，保证沟通正常进行。

12.1.2 沟通的方式

在进行沟通过程中，要根据沟通目标、参与者的特点选择适合的沟通方式。一般沟通过程所采用的方式分为以下几类：参与讨论方式、征询方式、推销方式(说明)、叙述方式，如图 12-2 所示。

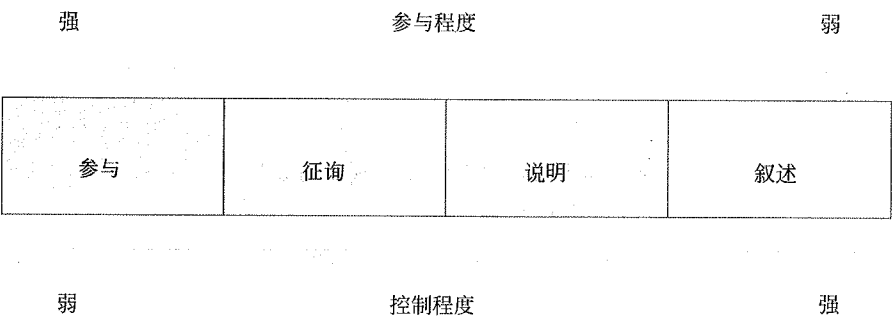


图 12-2 沟通方式

以上四类沟通方式从参与者(发送信息方)的观点看，参与讨论方式的控制力最弱，随后逐步加强，以叙述方式的控制力最强。从参与者(发送信息方)的观点看，其他参与者的参与程度恰巧相反，也就是讨论方式下参与程度最高，然后逐步减弱，以叙述方式下参与程度最弱。

沟通方式的选择根据发送信息方的要求决定，沟通方式的选择基本上基于以下因素进行选择：

- (1) 掌握信息的能力；
- (2) 是否需要听取其他人的意见和想法；

③ 是否需要控制信息内容。

以信息的发布者角度看，沟通方式选择矩阵提供了沟通方式选择的对比，如表 12-1 所示。

表 12-1 沟通方式选择对比

沟通过程方式	掌握信息的能力 (1-4) 1: 最弱 4: 最强	是否需要 听取他人的 意见和 想法	是否需要控 制信息内容	典型代表	控制强度 (1-4) 1: 最弱 4: 最强	参与程度 (1-4) 1: 最弱 4: 最强
讨论	1	是	否	头脑风暴	1	4
征询	2	是	否	调查问卷	2	3
推销	3	否	是	叙述解释	3	2
叙述	4	否	是	劝说鼓动	4	1

在发送方自认为已经掌握了足够的信息，有了自己的想法且不需要进一步听取多方意见时，往往选择控制力极强、参与程度最弱的“叙述方式”；其次，选择“推销方式”；而当自己掌握信息有限，没有完整成型的意见，需要更多的听取意见时，一般选择“讨论方式”或者“征询方式”。

12.1.3 沟通渠道的选择

1. 沟通渠道选择的要素

不同的情况下，采取何种沟通渠道（媒介）是沟通的参与者需要特别注意的。合适的沟通渠道可以促进沟通过程的顺利进行，帮助沟通的各方达到沟通的目标；而不适合的沟通渠道可能会阻碍沟通过程的实现，起不到促进沟通目标的实现的作用。

选择沟通渠道时，参与者应该根据以下因素进行多方面的考量。

- 信息本身的特性。
- 参与者的偏好。
- 沟通的目的。
- 参与者的熟练程度和理解能力。

沟通渠道的选择基本上从两个维度进行考虑。

1) 即时性维度

- 高度互动。
- 中等互动。
- 低等互动。

2) 表达方式维度

(1) 文字

① 优点

- 可永久性保存，容易查询；

- 节约时间，阅读速度要高于语言速度；
- 读者可根据自己的速度进行调整；
- 无地理位置要求；
- 更为精确和准确；
- 理论上可以多次无损复制传播。

② 缺点

- 纯文字资料损失了大量非语言符号，不利于情感的传递；
- 对于阅读者的选择没有控制力；
- 无法控制何时，以及是否被阅读。

(2) 语言

① 优点

- 可以传递情感；
- 可以同时进行跨地域沟通；
- 比邮件快；
- 不需要保存传递信息的优先选择渠道。

② 缺点

- 不利于建立促进个人关系（与面对面相比）；
- 无法表现肢体语言；
- 做不到文字资料的精确性和准确性，把握细节的能力不足；
- 说的速度比阅读速度相对要慢。

(3) 混合

① 优点

- 包括语言信息和非语言信息，沟通的信息含量最丰富；
- 建立集体关系和建立地位的最好渠道；
- 实时性最好；
- 实时做出反应和回复；
- 对接收对象的选择有一定的控制力。

② 缺点

- 与语言方式相同，非文字信息的速度要慢；
- 利用语言沟通的时候，细节把握性不强。

3) 必须有适当的条件

- 时间。
- 地点。
- 网络条件（网络视频会议）。
- 软件条件（网络演示、协同工作时）。

4) 如果需要保留相关信息, 要做额外的工作, 如录像, 会议纪要等

2. 沟通渠道及其特点

沟通渠道矩阵如表 12-2 所示。

表 12-2 沟通渠道及其特点

	高等: 即时性强	中等: 即时性中等	低等: 即时性弱
文字	短信 即时通讯	电子邮件 博客 维基	纸质文档 网站 群发邮件
语言	电话 电话会议		语音邮件 播客
混合	面对面 参与度较高和控制力较低类型的会议 视频会议	演讲和发布会 网络直播	

1) 纸质文档

纸质文档、电子邮件附件、传真都是纸质文档, 能够提供详细的信息, 阅读者可以选择仔细阅读还是简单浏览。

2) 网页(网站、博客、维基)

该渠道可以面向更多的沟通对象同时发布信息, 而且不受地域的限制, 更新速度相对较快。利于进行数据搜索, 可以提供更广泛的使用, 网站方式下信息发布方的控制力较强。

3) 电子邮件

该渠道可以快速地进行交流, 信件内容可繁可简, 信息量可详细可简略, 可以发送给特定人, 也可以同时发送给多个接收对象。

4) 博客

博客利用网络, 信息的发布者可以与其他网络用户进行较强的互动, 可以根据自己的想法组织文字, 建立自己的群体, 吸引志同道合者, 易于个人维护。

5) 维基

维基方式, 利用网络, 针对同一信息文档, 可以由多个作者共同维护, 可以跨地域合作(作者)进行, 可以匿名进行。信息更新实时性强, 信息获得原始资料的来源不受地域和时间的限制, 但是采用此方式的管理成本较高, 对于文档的控制力较弱。

6) 短信

短信利用手机直接进行快速的点对点通信的最好方式, 可以利用缩略语实现沟通, 接受者开会、开车、睡觉时或者时间紧迫又不能采用语言交流的情况下采用短信方式最好。

7) 即时通讯

它可以在任何智能终端上使用, 新型的即时通讯软件可以做到电脑、手机、平板电

脑上沟通信息的即时更新。信息发送可以进行加密发送，能够及时进行互动，可以传递包括文字内容（包括文件）、语音或视频等多媒体文件。可以利用网络同时与多人进行交流。

8) 语音邮件

它属于电子邮件的一种，但是附加了语音附件，显得更加友好，使用成本较低，即时性较好。

9) 播客

它利用网络进行语言直播，在没有管制的前提下自由性较强，基本上是单向的，可以建立自己的圈子。信息的接收者可以在任何地点，使用多种设备进行收听，而且成本较低。

10) 电话

适合点对点的语言交流，私密性强，技术要求低，即时性强（接通情况下），发起人对时间的控制能力强，沟通成本适中（比面对面的情况，能够节约交通成本和时间成本以及其他费用，如不同城市的两个人打电话谈事比一起到咖啡馆喝着咖啡直接交流要节约费用和时间）

11) 电话会议

它是多人在不同地点针对同一信息进行交流较好的方式，可以跨地域、跨时区进行，费用适中，对于参与者的技术要求较低（会用电话就行）。但是电话会议也有一些缺点，如是否能够全部接入参与者是个未知数（如当时对方电话占线、电话被停机、突然外出等），也不能确认是否真正参加会议（如接通电话后在忙着手头的事，而没有认真加入会议）。

12) 演讲和发布会

演讲和发布会一般是由权威部门或者个人发布正式信息的主要形式。信息的发布方可以选择发布的形式、时间、地点、材料形式等，同时能够及时获得参与者的反应和态度等。

13) 网络直播

它可以用来在网络直播演讲和发布，提供有限的沟通机会（利用文字、电话等方式对信息的发布者进行提问）。最大的优势包括：可以大面积的传播会议内容而不受管制，可以管理发布的音视频以及文字资料的内容，费用适中，对信息的接收方技术要求较低（根据选择的网络和软件系统而定）。

14) 面对面交谈

它是非常好的进行个人对个人的交流机会，能够促进建立良好的个人关系，交换信息、想法和情感，即时性强。

15) 面对面的征询或参与性会议

对于收集信息，引导参会者提供想法和积极参与讨论时，是一种较好的方式。能够面对面的获得信息、想法，而且能够及时获得参与者的态度和反应，还可以与参与者建

立良好的关系,解决一些群体性问题,达成一致意见,甚至取得统一的行动方案。

16) 视频会议

同时进行多地域、多人的实时沟通会议(包括音频、视频、文字资料),能大幅节约会议费用(与传统会议形式相比,非本地参会者无需住宿费,参与者的交通费、会场租赁费等都不会产生),实时性较强。

以上每一种沟通渠道的选择都应该针对具体问题进行分析,在分析的基础上再选择合适的沟通渠道,在进行沟通的过程中,采用多种渠道的混合方式可能更好。不过在进行沟通的过程中,不同对象、不同阶段,可以选择不同的沟通渠道,或者有不同的侧重。

在所有的沟通渠道的选择上,会议方式是最为常见的一种(包括传统会议、电话会议、视频会议、混合型会议),我们需要特别注意,进行会议的时候,需要同时召集多人(或组织)针对某些特殊的信息进行交流,不论是在一个地点举行,还是通过电话或者网络召开异地会议,会议的管理和控制都是非常重要的。会前有准备:事前安排好参会人员、时间、地点、会议议程、相关资料发放,参会人员会前准备等;会中有控制:会议进行中,如无特殊原因,应如期召开,按照会议议程进行,会议有主持;会后有结论:会议结束后,有会议纪要发放,有讨论结论等。

12.1.4 沟通过程的有效性

沟通过程的参与者进行沟通活动最终要实现的目的就是沟通的结果,所有的沟通活动最终要关注的就是有效的沟通结果。在这里,我们强调的是沟通结果的有效性,包括两个重要方面。

1. 效果

效果强调的是在适当的时间、适当的方式、信息被准确的发送给适当的沟通参与方(信息的接收方),并且能够被正确的理解,最终参与方能够正确的采取行动。

2. 效率

效率强调的是及时提供所需的信息。

12.1.5 沟通基本技能

沟通过程中沟通的参与者必须具备一定的沟通技能,只有参与者重视沟通,而且在愿意开展沟通的前提下,熟练掌握和使用沟通技能,才能顺利达到沟通的目的。参与者需要的具体沟通技能包括以下内容。

- (1) 主动倾听。
- (2) 有效利用多种手段,尽最大可能帮助自己理解信息内容。
- (3) 有效利用多种手段,加强团体的沟通技能。
- (4) 不回避问题,尽量了解事实真相。

- (5) 设定沟通目标，并采取必要的跟踪、验证手段确定是否达到沟通目标。
- (6) 具有多层次的沟通协商能力，能够保证最大程度的满足多方利益。
- (7) 强大的人格魅力和信用，能够帮助其他人树立信心。
- (8) 强大的表达能力，能够帮助其他人提振士气，增加团体的执行能力。

12.2 制订沟通管理计划

在项目进行的整个过程中，沟通无处不在，贯穿于始终。一个项目要想成功，离不开项目经理的沟通能力，项目经理利用好沟通，就可以做到事半功倍。如果利用不好，可能会适得其反。项目经理以及团队的沟通工作一定要做到位。沟通良好的项目成功率要远远大于那些沟通不畅的项目。在针对项目成功率与沟通良好与否的调查资料中表明，大部分失败的项目都存在沟通不良的背景。所以，项目经理需要花费大量的时间和精力进行项目的沟通工作。最为极端的调查报告表明，项目经理要拿出全部项目 80%~90% 的时间进行沟通工作。

“好的开始是成功的一半”，这句话用在项目的沟通管理中一点儿也不为过，要想做好项目的沟通工作，应该做到早计划，按照计划认真执行，并且根据实际需要进行调整。在本章后面的内容中会详细阐述针对项目的沟通管理。

沟通管理在项目计划、执行、监控过程中具有重要的作用，项目经理应该拿出大部分时间和精力进行沟通管理计划的制订，同时在项目的执行阶段按照计划执行，情况有变的时候进行适当地调整。在项目的早期，应该随着项目管理计划的制订，就着手制订项目沟通管理计划，根据项目的规模大小以及涉及的干系人的特点，可以单独制订项目沟通管理计划，也可以将沟通管理计划作为项目整个管理计划的一部分而不需要形成单独的文档。

在具体分析研究项目的基础上，项目经理应该根据项目的特点充分了解项目涉及的各方利益诉求，并且在项目的初期制订项目管理计划的时候就为沟通活动分配适当的时间、预算等项目资源。

12.2.1 制订沟通管理计划的输入

1. 项目管理计划

在制订项目沟通管理计划时，需要利用项目管理计划中有关项目执行、监控以及结束的相关信息，避免闭门造车，要做到有的放矢，有理有据。

2. 干系人登记册

干系人登记册为项目的沟通计划提供了干系人的信息，从干系人登记册中，可以知道项目中干系人的信息：主要沟通对象（主要干系人）、关键影响人、次要沟通对象（次要干系人）。

1) 主要沟通对象

项目经理要认真仔细地分析主要沟通对象,要了解他们的背景,以及他们的一些个人(或者组织)特点,他们需要的信息包括涉及项目的哪些内容,他们什么时候需要这些内容,以及与他们进行沟通时需要特别注意的方面。

2) 关键影响人

项目经理应认真查明在沟通过程中是否有些人或者组织具有特殊决定权,他们是否能够直接影响沟通的结果,如果有,要了解他们是谁、他们的权力范围、他们的影响力大小等等。

3) 次要沟通对象

项目经理还应该了解某些不是主要干系人和关键影响人的其他人或者组织,他们也许不是直接的项目参与者、供应商、使用者,但是他们可能对项目的实施具有潜在的影响力。

3. 事业环境因素

制订沟通管理计划必须符合组织结构对于项目沟通的政策要求,一般情况下,项目的沟通管理计划应符合组织的事业环境因素。

4. 组织过程资产

制订沟通管理计划应充分利用组织过程资产,全部的组织过程资产都有可能对制订项目沟通管理计划具有重要价值,尤其是以往项目的有关文档以及经验教训,对于项目经理制订项目沟通管理计划更具有指导意义。

12.2.2 制订沟通管理计划的工具

1. 分析沟通需求

通过沟通需求分析后,项目经理要确定项目干系人的信息需求,包括信息的类型、格式和价值。利用本章前一小节介绍的方法确定潜在的沟通渠道的数量,并且在分析研究的基础上去除认为不需要或者不重要的沟通渠道,保留最终认为需要而且有价值的沟通渠道,并且要最终确定信息沟通的双方,以及信息传递的途径。识别和确定项目沟通需求时应包括:

- (1) 组织结构图。
- (2) 组织与干系人的责任关系。
- (3) 项目涉及的学科、部门和专业。
- (4) 参与项目的人数和地点。
- (5) 内部信息需求。
- (6) 外部信息需求。
- (7) 干系人信息和沟通需求。

2. 沟通技术

可以采用各种技术在项目干系人之间传递信息。例如,从简短的谈话到冗长的会议,

从简单的书面文件到可在线查询的广泛资料（如进度计划、数据库和网站），都是项目团队可以使用的沟通技术。

3. 沟通模型

用于促进沟通和信息交换的沟通模型，可能因不同项目而异，也可能因同一项目的不同阶段而异。

4. 沟通方法

可以使用多种沟通方法在项目干系人之间共享信息。这些方法可以大致分为：

（1）交互式沟通。在两方或多方之间进行多向信息交换。这是确保全体参与者对特定话题达成共识的最有效的方法，包括会议、电话、即时通信、视频会议等。

（2）推式沟通。把信息发送给需要接收这些信息的特定接收方。这种方法可以确保信息的发送，但不能确保信息送达受众或被目标受众理解。推式沟通包括信件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、日志、新闻稿等。

（3）拉式沟通。用于信息量很大或受众很多的情况。要求接收者自主、自行地访问信息内容。这种方法包括企业内网、电子在线课程、经验教训数据库、知识库等。

项目干系人可能需要对沟通方法的选择展开讨论并取得一致意见。应该基于下列因素来选择沟通方法：沟通需求、成本和时间限制、相关工具和资源的可用性，以及对相关工具和资源的熟悉程度。

5. 会议

在本过程中，需要与项目团队展开讨论和对话，以便确定最合适的方法，用于更新和沟通项目信息，以及回应各干系人对项目信息的相关请求。这些讨论和对话通常以会议的形式进行。会议可在不同的地点举行，如项目现场或客户现场，可以是面对面的会议或在线会议。

12.2.3 制订沟通管理计划的输出

1. 项目沟通管理计划

本过程最主要的成果就是项目沟通管理计划，该计划描述了如何对项目沟通进行规划、执行和监控。

项目沟通管理计划一般应包括以下内容：

- （1）干系人的沟通需求。
- （2）针对沟通信息的描述，包括格式、内容、详尽程度等。
- （3）发布信息的原因。
- （4）负责信息沟通工作的具体人员。
- （5）负责信息保密工作的具体人员的授权。
- （6）信息接收的个人或组织。
- （7）沟通渠道的选择。

- (8) 信息传递过程中所需的技术或方法。
- (9) 进行有效沟通所必须分配的各种资源, 包括时间和预算。
- (10) 沟通频率, 例如, 每周沟通等。
- (11) 上报过程, 针对下层无法解决的问题, 确定问题上报的时间要求和上报路径。
- (12) 项目进行过程中, 对沟通管理计划更新与细化的方法。
- (13) 通用词语表、术语表。
- (14) 项目信息流向图、工作流程图、授权顺序、报告清单, 会议计划等。
- (15) 沟通过程中可能存在的各种制约因素。
- (16) 沟通工作指导以及相关模板。
- (17) 有利于有效沟通的其他方面, 比如, 建议的搜索引擎, 软件使用手册等。

沟通管理计划也可包括项目状态会议、项目团队会议、网络会议和电子邮件等各方面的指导原则。针对具体项目的不同要求和项目可利用资源, 沟通管理计划可以以多种方式存在, 正式的或非正式的、详细的或简单概括的、包含在项目总体管理计划内或者项目总体管理计划的从属部分等。项目中的沟通过程通常会形成额外的可交付成果, 也需要额外的时间和精力分配, 因此在项目工作分解结构、项目进度计划和项目预算等其他项目管理文件需要同时做出相应地更新调整。

2. 项目文件更新

进行制订项目沟通管理计划的时候, 可能需要对项目中的其他项目管理文件进行调整和修改, 如项目进度计划、干系人登记册等。

12.3 管理沟通

沟通管理计划制订后, 在项目的执行阶段中, 没有特殊情况下, 应严格按照计划执行, 包括生成、收集、发布、存储、检索、处置项目信息等过程。进行沟通过程管理的最终目标, 就是保障干系人之间有效地沟通。有效地沟通包括效果和效率两方面的内容。

12.3.1 管理沟通的输入

1. 项目沟通管理计划

在没有特殊因素的影响下, 应该严格按照制订的计划执行。

2. 工作绩效报告

项目进行过程中, 项目经理应该定期或者不定期的检查项目的进度、成本等有关项目当前的绩效以及状态, 并且形成工作绩效报告。全面的、准确的、及时的工作绩效报告有利于进行讨论和建立沟通, 是高质量沟通的保证。

3. 事业环境因素

项目进行过程中, 项目经理还应该注意可能对沟通产生影响的各种事业环境因素,

如组织文化结构、政府、行业标准和规定以及项目管理信息系统等。

4. 组织过程资产

项目进行过程中，项目经理还应该注意可能对沟通产生影响的各种涉及到组织过程资产的因素，如沟通管理的政策、程序、过程、指导、文档模板、历史资料和经验教训。

12.3.2 管理沟通的工具

1. 沟通技术

选择沟通技术是管理沟通过程中的一项重要工作。由于不同项目所使用的沟通技术可能差别很大，在同一项目生命周期的不同阶段也可能差别很大，因此重点是确保所选择的沟通技术适合所需沟通的信息。

2. 沟通模型

选择沟通模型是本过程的一项重要工作。由于沟通模型中的各个要素都会影响到沟通的效率和效果，因此重点是要确保所选择的沟通模型适合正在开展的项目，确保识别出并管理好沟通模型中的任何障碍（噪声）。

3. 沟通方法

选择沟通方法是本过程的一项重要工作。由于在管理沟通过程中存在许多潜在障碍和挑战，因此重点是要确保已创建并发布的信息能够被接收和理解，从而可以对该信息进行回应和反馈。

4. 信息管理系统

项目经理在管理项目时，可以采用多种信息管理系统，只要是能够对沟通管理起到促进作用的，又不会受到资金、成本等方面制约的信息管理系统都可以使用，如传统的纸质文件管理系统、电子信息交流系统、专业的信息管理系统等。

5. 绩效报告

项目经理在项目进行中，按照计划要求，定期或不定期的要进行以下工作：

（1）收集和发布信息；

（2）分析现状、进展以及预测结果的汇报绩效的工作。

绩效报告的工作，一方面要全面收集需要的信息，并且与基准值（基线）进行比较和分析，对后期工作进行预测和展望。在与干系人进行沟通时，做到言之有物、合理分析、准确预测的效果。

12.3.3 管理沟通的输出

1. 项目沟通

项目经理管理项目时，由于项目不同或者实施阶段不同，所产生的沟通结果也未必相同。常见的成果有绩效报告、可交付物当前状态、当前进度状态、当前成本状态等。项目经理在进行沟通的时候，需要注意信息的来源、存在的形式、详细程度、正式程度、

保密级别的不同点，使用时要酌情处理。

2. 更新的项目管理计划

项目经理在项目进行中，由于绩效不同、进度偏差、质量偏差、成本偏差等因素的影响，可能需要更新项目管理计划。

3. 项目文件更新

可能需要更新的项目文件包括问题日志、项目进度计划、项目资金需求。

4. 更新的组织过程资产

项目经理在项目进行中，可能需要对如下组织过程资产进行更新。

1) 干系人通知

- (1) 已解决问题；
- (2) 已批准的变更；
- (3) 项目总体状态。

2) 项目报告

以正式或非正式的报告形式报告当前项目状态，并更新组织过程资产。

3) 项目演示资料

使用合理的演示手段向干系人提供信息。

4) 项目日志

保存记录与项目有关的各种文档（纸质介质和电子资料），包括信函、备忘录、会议纪要等文件。

5) 回馈信息

有可能对于调整或提高项目未来绩效起到重要作用的干系人回馈信息。

6) 经验教训文档

项目出现的问题以及问题产生的原因、采取措施的理由以及行动策略的记录，或者是记录沟通管理的其他经验教训的记录，都可以保存在组织的历史数据库中，并且根据需要进行管理和发布。

12.4 控制沟通

在项目执行的过程中，需要对沟通过程进行适当的监督和控制，确保沟通过程的目的能够实现。在进行沟通控制的过程中，有可能需要重新调整、更新或者重新制订沟通管理计划，也有可能需要重新调整、更新沟通过程的管理过程。在项目的整个生命周期中，五个过程组在不断地循环往复，是持续进行的。项目经理在进行控制的过程中，一般性的沟通目标的改变，或者绩效指标发生偏差时，无需进行大规模的调整；但是，如果出现严重的偏差，项目经理需要对项目进行大规模调整的时候，针对沟通管理的调整就是必要的。

12.4.1 沟通过程控制的输入

1. 项目管理计划

项目管理计划为控制沟通过程提供了有关项目执行、监督、控制和收尾方面的信息，包括的内容有但不限于：

- (1) 干系人的沟通需求；
- (2) 信息发布的原因；
- (3) 信息发布的时限和周期；
- (4) 信息发布者的负责人或组织；
- (5) 信息接收者的负责人或组织。

2. 项目沟通

详见 12.2 节。

3. 问题日志

问题日志记录项目中出现的问题，并且还包含有关如何解决问题的相关信息。在正式的问题日志中，还应记载负责人以及时间限制等因素，有助于快速准确的解决问题，为当前干系人之间的沟通提供信息，并且为以后的再次沟通建立了良好的沟通平台。

4. 工作绩效数据

项目经理通过收集信息，进行总结，并且与绩效测量基准进行比较，可以帮助项目经理判断项目执行情况并进行适当发布。

5. 组织过程资产

能够影响控制沟通过程的组织过程资产有很多，如：

- (1) 报告模板；
- (2) 确定的沟通政策、标准和程序；
- (3) 特殊规定的沟通技术；
- (4) 适用的沟通渠道（媒介）；
- (5) 数据保存政策；
- (6) 安全要求。

12.4.2 控制沟通的技术和方法

1. 信息管理系统

项目经理可以利用信息管理系统来获取、保存、发布有关项目的多方面信息，包括成本、进度和绩效。项目经理可以合理使用各种可供利用的手段为干系人提供所需要的信息，可以利用不同的软件汇总整合多方面的信息；可以利用电子表格、报表、图表、多媒体演示等多种方式展示数据以及分析结果；可以面向不同的干系人提供不同详细程度的信息（如面向技术人员和管理人员所提供针对同一事项的信息的详细程度就未必相

同，而他们所关心的角度也未必相同)。

2. 专家判断

项目经理在进行控制沟通过程中，借助专家以及专家组的能力和经验也是一个很好的选择，尤其是有从事过类似项目的专家对项目沟通进行评估、提供意见是非常重要的。在专家的帮助下，可以更为准确地进行评估，迅速采取有效的行动，进行强有力的干预。专家不一定是本组织或者从事过类似项目的人或者组织，也可以是有能力或者经过特殊培训的个人或者组织，如：

- (1) 组织内的其他部门；
- (2) 顾问；
- (3) 干系人（有经验的客户或者发起人也是专家）；
- (4) 专业技术协会；
- (5) 行业团体；
- (6) 专门研究相关领域的专家；
- (7) 项目管理办公室。

3. 会议

项目经理在项目的整个生命周期中，需要根据计划定期或不定期地召开会议，有的时候是团队内部会议，有的时候是与项目干系人进行的外部会议；有的时候是在施工现场召开，有的时候是在客户的办公室召开；有的时候采取传统会议模式，有的时候采取网络会议模式。召开会议是帮助我们团队进行讨论，发现问题，解决问题，确定行动方案，或者与项目干系人的信息交流，满足其沟通需要。项目中的定期会议包括如下会议。

1) 项目的例会

项目的例会通常是项目中最重要会议之一，一般以周为单位召开，是项目团队内部沟通的主要平台。对于某些大型项目也可以双周或月为周期。

一般来讲，项目例会由项目经理主持召开，主要议题如下：

- (1) 项目进展程度调查和汇报；
- (2) 项目问题的解决；
- (3) 项目潜在风险的评估；
- (4) 项目团队人力资源协调。

2) 项目启动会议

项目启动会议一般在项目团队内部和外部分别举行。内部启动会议重要解决内部的资源调配和约束条件的确认，而外部启动会议主要是协调甲方和乙方的项目接口工作。

3) 项目总结会议

项目总结会议的目的如下：

- (1) 了解项目全过程的工作情况以及相关的团队或成员的绩效状况；

- (2) 了解出现的问题并提出改进措施；
- (3) 了解项目全过程中出现的值得吸取的经验并进行总结；
- (4) 对总结过后的文档进行讨论，通过后就存入公司的知识库，从而形成公司的知识积累。

12.4.3 控制沟通的输出

1. 工作绩效信息

项目经理收集绩效信息，进行组织和总结，并且进行相关比较分析后提供给不同的干系人。不同的项目干系人所关注的信息侧重点不同，所需要的详细程度也不一样，项目经理应该认真做好分析，并且进行整理后，再发送给相关的项目干系人。

2. 变更请求

控制沟通过程经常导致调整需求、采取行动和进行干预的事情发生，导致项目发生变更请求，请求的变更应该通过整体变更过程来进行管理。如果变更请求被批准，还会导致更多的变化。如：

- (1) 新的或者更新的成本估算、活动排序、进度、资源需求和风险应对方案；
- (2) 调整项目管理计划和文档；
- (3) 纠正措施；
- (4) 预防措施。

3. 更新的项目管理计划

它可能引起对项目管理计划和沟通管理计划的修改和更新。

4. 更新的其他项目文件

有些项目文件也有可能需要进行更新，如预测、绩效报告、问题日志等。

5. 组织过程资产更新

有些情况下，在项目中采用了一些更为有效的模板、文档格式、经验教训、日志等都是项目和组织过程资产历史数据的一部分，可以为当前项目提供服务（如分析问题成因，采取措施的理由和结果等），也可以为其他项目提供参考借鉴。

12.5 项目干系人管理

[导入案例 1] 杭州九峰村垃圾焚烧发电厂项目

根据《杭州市环境卫生专业规划修编（2008-2020 年）修改完善稿》，杭州余杭区中泰乡九峰村将规划建设垃圾焚烧发电厂。因规划的垃圾焚烧发电厂毗邻众多水源地，并且当地也是重要的龙井茶产地，引发当地村民对环境污染的担忧。

2014 年 4 月 24 日，杭州中泰乡九峰村群民及附近城区居民向杭州市规划局提交了一份 2 万多人反对九峰垃圾焚烧发电厂的联合签名，以及 52 人要求对《杭州市环境卫生

专业规划修编(2008-2020年)修改完善稿》公示提出听证的申请。

2014年5月8日晚上,当地村民发现有车辆运输测量仪器到预定的垃圾焚烧发电厂厂区,于是开始不断有人到九峰村抗议。

5月10日下午3时许,有居民爬到穿过九峰村的零二省道和高速路上,想让过往车辆看到他们的抗议,造成车辆拥堵。大批警力等到现场维持秩序,警方在高速公路想要驱散抗议的群众,双方为此发生了言语、肢体冲突,一些群众受伤,被送往当地医院。

5月10日,杭州市余杭区政府网站发布《余杭区人民政府关于九峰环境能源项目通告》,对近日发生的市民聚集事件作出正面回应。

通告称,九峰项目是杭州市重点环保项目和民生项目,在项目没有履行完法定程序和征得大家理解支持的情况下,一定不开工,九峰矿区也停止一切与项目有关的作业活动。通告称,九峰项目前期过程中,将邀请当地群众全程参与,充分听取和征求大家意见,保证广大群众的知情权和参与权。

通告还称,希望广大群众不要再到九峰矿区和中泰街道办事处集聚,保持正常的社会公共秩序,共同维护社会大局的稳定。

针对项目附近居民的疑虑,如九峰项目究竟是否安全、为何要选址在这里、后续的监管等诸多问题,杭州市九峰垃圾焚烧项目建设推进领导小组办公室进行了一一解答,部分地消除了大家的顾虑,也为项目的顺利开展消除了一些障碍。

搞好项目干系人管理,需要花费很多的精力去沟通和协调。如果忽视了关键干系人的诉求,不仅会给项目带来时间上的延迟,也会给项目带来巨大的风险。

类似杭州市九峰垃圾焚烧这样的项目,在国内有很多,它们也或多或少的遇到了类似的问题。

附近居民的心声:垃圾焚烧项目引抗议,民众为什么会抗议?还不是因为污染大。改革开放30多年,牺牲了环境、牺牲了碧水蓝天换来了经济的高速发展。我们习惯于说先发展后治理,但在民智已开的时代,如果政府一意孤行要替老百姓做主而不是听取百姓民意,这样的垃圾GDP又有何意义?

[导入案例2] 缅甸密松水电站建设项目

密松水电站是缅甸伊洛瓦底江干流上游的水电站,是世界上第15大水电站,于2009年12月正式开工建设。由中国电力投资集团、缅甸电力部、缅甸亚洲世界公司组成的合资公司投资建设,其中中国电力投资集团是最大的投资方。

项目开工以来,有关密松大坝的传言不断,什么“破坏自然环境”“可能出现溃坝”“企业社会责任不达标”“移民补偿款发放不公”等未经证实的消息乱飞。2010年2月,设在英国的克钦民族组织在英、日、澳洲、美等地的缅甸大使馆抗议兴建密松水电站。一些反对密松水电站的非政府组织也积极组织反密松水电站活动。

该项目建设进行到2011年9月30日时,缅甸时任总统吴登盛致函下议院说“缅甸政府是民选政府,必须尊重人民意愿”,突然单方面以“人民反对”为理由宣布在他的任

期内搁置密松水电站。

中国电力投资集团公司已经在密松水电站先后投入 30 多亿元人民币，基本上荒废了。现在这个项目还在搁置，开工遥遥无期。因为是贷款，这些资金的财务付息和人员维护费还以每年 3 亿元的速度递增。同时，公司面临供应商、施工单位等有关合同方巨额违约索赔。除此之外，对于搁置在项目工地现场的大型施工设备的维护、保养和租赁费用，公司每月还要损失上千万元人民币。

评论：不是说项目的反对者做得不对，其实中国电力投资集团确实有缺失，因为我们习惯于走上层路线，忽视普通民众的诉求，总是在事情发生之后才寻求解决之道，但是已经无解了。“只与政府打交道”是密松搁置后，中国电力投资集团被诟病的原因之一。

机会闪现：缅甸反对党民盟领袖昂山素季 2015 年 9 月 21 日在仰光乡村进行拉票活动时表示，如果民盟 11 月赢得大选并能组织政府的话，将会把密松项目合同内容向民众公开，然后才做是否重建的决定。2015 年 11 月，昂山素季所在的民盟已经赢得大选，密松水电站项目何去何从，我们拭目以待。

由上面的案例，可以看出：项目不是在真空中开展，也不是项目建设方一家可独自决定的事情，受许多项目干系人的影响。

项目干系人有许许多多、需求也各种各样、对项目的影响有大有小、对项目的态度有支持有反对，怎么样做才能降低敌意、增加支持度呢？项目干系人管理就是回答这个问题的。

至于 IT 项目，也同样会遇到形形色色的问题，甚至是更为复杂、更为棘手的问题。例如早期的小灵通基站建设，一般把基站建在居民小区，甚至建在居民楼的楼顶上，因居民听信“辐射致癌”的传言而屡屡毁坏基站，后来电信员工不仅增加了安全装置、还专门开办了科普教育，甚至伪装了基站才得以解决这些问题。

由上面的案例可以看出，要想项目成功，除了项目团队齐心协力之外，还得争取相关干系人的理解和支持，同时通过沟通降低一些干系人的阻挠，这就需要对项目的干系人进行管理。

沟通管理和项目干系人管理的联系和区别：

沟通管理强调对项目信息的计划、收集、存储、组织、发布，以及监控沟通以保证它的高效性。

项目干系人管理强调的不仅是要管理干系人的期望，更要保证他们的适度参与，而后者是项目成功非常关键的因素之一。

12.5.1 项目干系人管理所涉及的过程

项目干系人管理，并不是领导项目的干系人，而是对项目干系人的需要、希望和期望的识别，并通过沟通上的管理来满足其需要、与干系人一起解决问题的多个过程。项

目干系人管理努力争取更多关系人的支持、努力降低干系人中的反对者的阻力,持续不断地推动项目向目标前进,从而能够确保项目取得成功。

对项目干系人进行积极管理,可促使项目沿预期轨道行进,而不会因未解决的项目干系人问题而脱轨。同时进行项目干系人管理还可以提高团队成员协同工作的能力,并预防对项目产生的干扰。

通常,由项目经理负责项目干系人管理。

项目干系人管理的具体内容如下。

1. 识别干系人

首先,项目存在众多项目干系人,项目干系人从项目中获利或受损,对项目的开展会有推进或阻碍的作用。我们要分类找出所有的项目干系人,分析他们对项目的影响或者项目对他们的影响,还要知道影响有多大,因此需要“识别干系人”过程来完成这些任务。

2. 编制项目干系人管理计划

识别出干系人后,项目经理还有依据项目跟干系人之间互相影响的大小、项目干系人的需要,确定干系人管理的思路,确定对项目干系人进行沟通的措施,并制定信息沟通等级,为此要“编制项目干系人管理计划”。

3. 管理干系人参与

在项目的整个生命周期中,还要与项目的干系人维持不断地沟通,解决他们之间的问题,这就需要“管理干系人参与”过程。

4. 项目干系人参与的监控

在依据项目干系人管理计划在项目整个生命周期中管理项目干系人时,还要根据需要定期地或者及时地监控干系人之间的关系,观察计划和实际之间的偏差,管理干系人之间的冲突,为项目推进助力,并尽量减少对项目的干扰。这个过程就是“项目干系人参与的监控”。

每个项目都有干系人,他们受项目的积极或消极影响,或者能对项目施加积极或消极影响。有些干系人影响项目的能力有限,而有些干系人可能对项目及其期望结果有重大影响。项目经理正确识别并合理管理干系人的能力决定着项目的成败。

在项目的开发过程中,遇到的典型干系人如下。

1. 客户

一般来讲,客户关注的始终是如何使自己的投资有最丰厚和深远的回报,同时又将风险控制到最低。因此,客户关心的不仅仅是项目能否完成,还包括整个项目的进度、费用情况以及施工的质量等环节。

2. 用户

项目产品的最终使用者就是用户。用户关系的是:这个项目产品是否好用?是否大幅度降低本岗位的劳动强度?是否大幅度地提高本岗位的工作质量?

3. 高层领导

项目承建方高层领导通常关注项目是否按照计划进行，是否符合项目的目标，项目团队的绩效是否能够保持。因此，项目经理一定要清楚在不同的项目中，自己的项目在高层领导眼中的优先级和地位。项目经理还要保持和高层的沟通，以获得资源的支持。

4. 项目团队

第三个重要的沟通对象就是项目团队，项目成功与否取决于项目经理的管理，但项目经理必须清楚项目成功依靠的是整个项目团队的共同努力。因此，加强和项目团队成员的沟通是非常重要的事情。

例如在项目计划阶段，需要项目团队成员提供计划的依据，这时沟通就起到非常重要的作用。而在施工阶段，项目经理要确保对项目的运作有清晰的了解，同样也必须依靠项目团队成员。

5. 社会人员

现在的 IT 项目，有很多是基于 Web 的。因此从理论上讲，凡是通过 Internet 能过登录项目 Web 的人，都算项目的干系人。在这些人中，除上述人员之外，还有更多的社会人员。客户希望通过 Internet 这个工具宣传自己的企业及其产品和服务，从而扩大市场影响，但要注意信息安全，提高服务意识。

前面的[导入案例 1]中的杭州余杭区中泰乡九峰村及其附近居民就属于社会人员，他们是受项目影响、又反过来影响项目的干系人。

6. 其他

还有一些重要的项目干系人，如项目明确的支持者或者隐含的支持者、项目明确的反对者或者隐含的反对者。

12.5.2 识别项目干系人

什么是项目干系人？

项目干系人是能影响项目决策、活动或结果的个人、群体或组织，以及会受或自认为会受项目决策、活动或结果影响的个人、群体或组织，客户、发起人、执行组织和有关公众等都是典型的干系人。干系人可能来自组织内部的不同层级，具有不同级别的职权；也可能来自项目执行组织的外部。

通过识别干系人过程，找出项目的所有干系人，并初步分析和记录他们的信息，并根据这些信息对他们进行分类。有关他们的典型信息有：他们的角色、所在的部门、他们对项目的影响力、他们的利益、他们的期望、他们受到的项目影响……

在项目启动时，就识别出关键干系人是非常重要的。只有这样，才有可能发现他们的诉求和影响力，以便在项目的整个生命周期中通过与项目关键干系人的沟通和期望管理，使其行为对项目产生正面的影响。前面提到的典型干系人就包括了关键干系人。

项目干系人如图 12-3 所示。

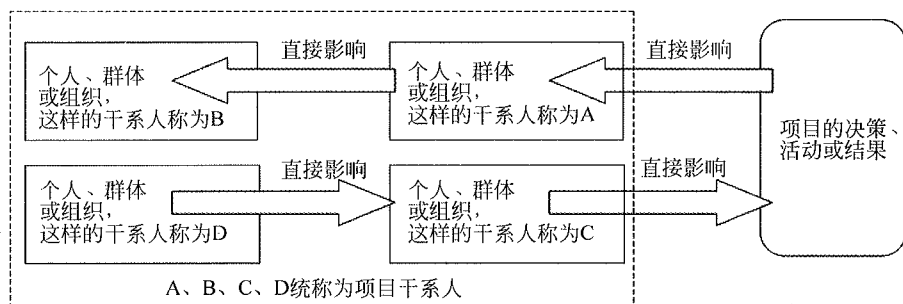


图 12-3 项目干系人

在项目的初期、在制定项目计划之前，就要识别项目的干系人，并分析他们的利益层次、个人期望、重要性和影响力，这对项目成功非常重要。应该定期审查和更新早期所做的初步分析。由于项目的规模、类型和复杂程度不尽相同，大多数项目会有形形色色且数量不等的干系人。由于项目经理的时间有限，必须尽可能有效地利用，因此应该按干系人的利益、影响力和参与项目的程度对其进行分类，并注意到有些干系人可能直到项目或阶段的较晚时期才对项目产生影响或显著影响。通过分类，项目经理就能够专注于那些与项目的成功密切相关的重要干系人。

图 12-4 示意了识别干系人过程。

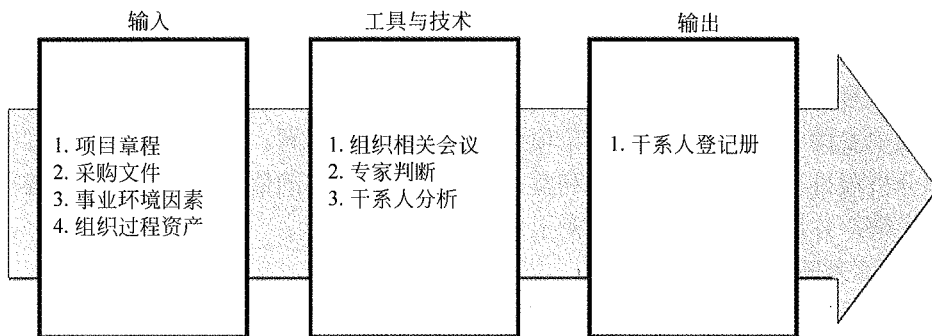


图 12-4 识别干系人过程

1. 识别干系人的输入

识别干系人之前，得先了解项目章程、采购文件、事业环境因素和组织过程资产。

1) 项目章程

项目章程里不仅可以找到一些关键的干系人，如项目发起人、客户、团队成员、项目参与小组和部门，以及受项目影响的其他个人或组织，还可以提供与干系人有关的信

息如项目受到的约束、项目的完工日期等。

2) 采购文件

如果项目是签订合同后才实施的，或者项目的一部分任务需要外包才能完成，那么合同各方都是关键的项目干系人，合同就是重要的采购文件。

3) 事业环境因素

能够影响识别干系人过程的事业环境因素包括但不限于：

(1) 项目实施单位的企业文化和组织架构，从中可以找到项目实施单位内部的关键干系人。

(2) 政府或行业标准（如法规、产品标准），从中可以找到项目实施单位外部的、来自于政府监管部门和行业监管部门的关键干系人。

(3) 全球、区域或当地的趋势、实践或习惯，从中可以找到项目用户或潜在用户等关键干系人。

4) 组织过程资产

能够影响识别干系人过程的组织过程资产包括但不限于：

(1) 干系人记录的模板；

(2) 以往项目或阶段的经验教训，尤其是管理干系人方面的经验教训；

(3) 以往项目的干系人记录。

2. 识别干系人所使用的工具和技术

识别干系人过程中，常用的工具与技术有组织相关会议、专家判断和干系人分析。在实际实施项目时，根据需要这些工具和技术可以交替使用。

1) 组织相关会议

根据项目的规模、项目干系人的多寡，项目经理可以组织召开专门的会议、可以在例行会议中安排专门的时间段来讨论项目干系人的识别问题。项目经理可以通过会议来交流和分析项目各干系人的角色、利益、知识和整体立场的信息，以加强对关键项目干系人的了解，并把会议成果整理记录下来。

2) 专家判断

在项目经理缺乏干系人管理经验的情况下，为了找出尽可能多的全部干系人，应该向有经验的小组或个人寻求专家判断和专业意见，典型的专家如下：

(1) 项目实施单位内部的高级管理人员；

(2) 项目实施单位内部的其他部门；

(3) 已识别出的、具有相关经验的关键干系人；

(4) 在相同领域、有过管理项目干系人经验的其他项目经理；

(5) 相关业务或项目领域的专家；

(6) 行业团体和顾问；

(7) 专业和技术协会。

可通过单独咨询（一对一会谈、访谈等）或小组对话（焦点小组、调查等），获取专家判断。

3) 干系人分析

干系人分析是系统地收集和分析各种定量与定性信息，以便确定每类干系人在整个项目中有哪些利益？有哪些要求？有哪些影响？受到哪些影响？……

通过干系人分析，还要了解干系人之间的关系（包括干系人与项目的关系，干系人相互之间的关系），以便利用这些关系来建立联盟和伙伴合作，从而提高项目成功的可能性。

干系人分析贯穿项目的始终，在项目或阶段的不同时期，应该对干系人之间的关系施加不同的影响。

干系人分析通常应遵循以下步骤。

（1）识别全部潜在项目干系人及其相关信息，如他们的角色、部门、利益、知识水平、期望和影响力。关键干系人通常很容易识别，包括所有受项目结果影响的决策者和管理者，如项目发起人、项目经理和主要客户。通常可对已识别的干系人进行访谈，来识别其他干系人，扩充干系人名单，直至列出全部潜在干系人。

（2）识别每个干系人可能产生的影响或提供的支持，并把他们分类，以便制定管理策略。在干系人很多的情况下，就必须对关键干系人进行分类和排序，以便有效分配精力，来了解和管理关键干系人的期望。可用的分类方法有多种，包括（但不限于）：

① 权力/利益方格，根据干系人的职权（权力）大小以及对项目结果的关注程度（利益）进行分组；

② 权力/影响方格，根据干系人的职权（权力）大小以及主动参与（影响）项目的程度进行分组；

③ 影响/作用方格，根据干系人主动参与（影响）项目的程度以及改变项目计划或执行的能力（作用）进行分组；

④ 凸显模型，根据干系人的权力（施加自己意愿的能力）、识别干系人紧急程度（需要立即关注）和合法性（有权参与），对干系人进行分类。

第一种分析方法是权力/利益方格，如图12-5所示。

权力/利益矩阵是根据干系人权力的大小，以及利益对其分类。这个矩阵指明了项目需要建立的与各干系人之间的关系种类。

首先关注处于B区的干系人，他们对项目有很高的权力，也很关注项目的结果，项目经理应该“重点管理，及时报告”，应采取有力的行动让B区干系人满意。项目的客户和项目经理的主管领导，就是这样的项目干系人。

尽管C区干系人权力低，但关注项目的结果，因此项目经理要“随时告知”项目状况，以维持C区的干系人的满意程度。如果低估了C区干系人的利益，可能产生危险的后果，可能会引起C区干系人的反对。大多数情况下，要全面考虑到C区干系人对项目

可能的、长期的以及特定事件的反应。

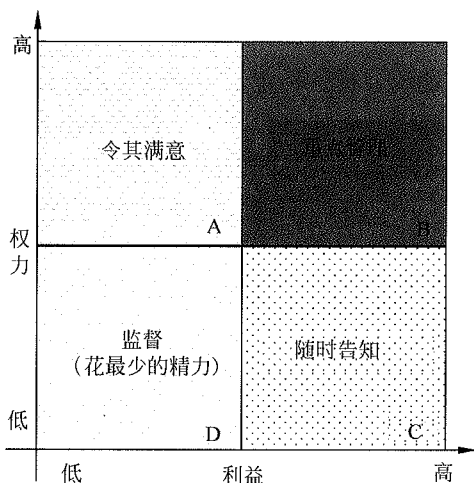


图 12-5 干系人权力/利益方格示例

处于 C 区的干系人，项目经理应该“随时告知他们项目的状态，保持及时的沟通”，像[导入案例 1]中的杭州中泰乡九峰村群民及附近城区居民，就是这样的项目干系人。

方格区域 A 的关键干系人具有“权力大、对项目结果关注度低”的特点，因此争取 A 区干系人的支持，对项目的成功至关重要，项目经理对 A 区干系人的管理策略应该是“令其满意”。

最后，还需要正确地对待 D 区中的干系人的需要，D 区干系人的特点是“权力低、对项目结果的关注度低”，因此项目经理主要是通过“花最少的精力来监督他们”即可。但有些 D 区的干系人可以影响更有力度的干系人，他们对项目发挥的是间接作用，因此对他们的态度也应该“要好一些”，以争取他们的支持、降低他们的敌意。

总之，在对干系人分类制定出对策后，还应该让项目干系人尽可能早的参与项目，比如在启动阶段就介入，这通常有助于改善和提高分享项目所有权、认同可交付成果、满足干系人要求的可能。也更利于争取他们在项目管理过程中的支持，从而提高项目成功的可能性。

其他分类模型如权力/影响、权力/作用和凹凸模型的详细讲解，请见博文：<http://blog.sina.com.cn/gaozhsh2009>中的“项目管理-随感及转载”分类里的“管理项目干系人时，巧用工具可以事半功倍（1/3）”以及随后的两篇 2/3 和 3/3。

（3）评估关键干系人对不同情况可能做出的反应或应对，以便策划如何对他们施加影响，提高他们的支持和减轻他们的潜在负面影响。

3. 识别干系人的输出

识别出项目的所有干系人后，要把结果整理、记录在干系人登记册里。

1) 干系人登记册

干系人登记册是识别干系人过程的主要成果，用于记录已识别的干系人的所有详细信息，包括但不限于：

(1) 基本信息如干系人的姓名、职位、地点、项目角色、联系方式。

(2) 用于评估的干系人信息如主要需求、主要期望、对项目的潜在影响、与生命周期的哪个阶段最密切相关。

(3) 干系人分类如关键干系人/非关键干系人、内部/外部、支持者/中立者/反对者等。

因为一次识别不能穷尽所有的项目干系人，况且项目在动态地变化着，因此应定期检查干系人登记册，必要时补充、更新干系人登记册，因为可能会识别出新的干系人，也可能调整登记册。

项目是为了满足客户、用户等干系人的需求而设立的，因此干系人登记册为收集项目的需求提供了依据，同理干系人登记册也为编制质量计划、编制沟通计划、编制风险管理计划、识别风险、编制采购管理计划和编制干系人管理计划提供了依据。

[新能源汽车研发案例]

某新能源汽车研发项目的干系人管理案例背景：

B市地处中国北方，人口达2000万，一年里有100天处于雾霾之中，严重损害了市民的健康，也损害了中国的国际形象。

造成雾霾的元凶之一是汽车尾气，因此发改委响应国务院的号召，大力鼓励支持新能源汽车的开发和运营，其战略目标为：根据我国能源结构特点，通过新能源汽车的推广和使用，通过大城市公共交通系统的推广来改善空气质量，通过鼓励技术创新实现国产汽车工业振兴。

B市新能源汽车公司承担了国家863电动汽车项目。发改委对该项目提供了主要的资助，同时B市地方政府、新能源汽车公司以及其他6家参与单位也对该项目提供了配套资金。该项目是一个庞大的系统工程，各资助方对该项目都寄予了不同的期望。项目组制订了雄心勃勃的计划和目标：

(1) 研究开发新一代电动汽车技术平台，尤其是其核心——电动汽车动力驱动关键技术。

(2) 通过科技创新，最终实现产业化，带动中国汽车工业的发展。

(3) 建立电动车新兴交叉学科体系，带动相关工程学科内容的更新换代并培养一批人才。

同许多类似的项目一样，该项目也面临严格的时间节点限制、成本控制和质量要求的压力。满足这些要求对项目组的项目管理水平提出了严峻的挑战。

项目经理侯宇接到任务后，对干系人进行了识别，编出了如表12-3所示的干系人登记册。

表 12-3 B 市新能源汽车开发项目—干系人登记册

编制: 项目经理

侯宁

批准: QA

2010-10-10

序号	基本信息					立场	评估信息			
	姓名	单位	职位	项目角色	联系方式		主要需求	主要期望	影响	管理这些关系的建议
1	王华明	国务院发改委	副主任	发起人	139……, EMAIL: ……	支持者	降低污染、改善空气质量。为我国汽车工业找到新的增长点	通过这个项目, 促进创新带动相关行业, 促进国民经济发展	重要	重点管理, 及时汇报, 重大问题及时提示
2	刘亚东	工信部	司长	政府协调者	133……, EMAIL: ……	支持者	希望项目成功	希望获得政绩	重要	重点管理, 每隔一个月找时间采取正式或非正式的时间汇报项目的进展情况, 已取得支持
3	柳亚明	B 市政府	司长	地方政府	136……, EMAIL: ……	支持者	改善空气质量, 拉动地方经济	本市的新能源汽车成为行业、市场的第 1 名	重要	重点管理, 争取地方的资金、场地、市场的支持
4	张新生	某新能源汽车公司	副总经理	领导者	137……, EMAIL: ……	支持者	希望项目成功, 新能源汽车能挣钱	推广到其他省市	重要	重点管理, 定期汇报, 根据需要不定期汇报, 争取他解决项目问题, 在公司内协调
5	项目团队	项目团队		实施者	188……, EMAIL: ……	实施者	通过项目来获得个人职业的成长	能从项目成果得到一辆车、获得买房的首付款	重要	重点管理, 指明项目的远景、激励激发团队的积极性。对发现的问题及时疏通、及时解决, 对普通的问题周例会讨论解决
6	电池组	供应商 1		协助者	158……, EMAIL: ……	协助者	能及时拿到货款	能够得到长期的订单	重要	随时告知, 注意产品的质量、注意交货日期
7	用户	用户		新能源汽车的购买者、使用者	155……, EMAIL: ……	支持	价格合理、续航里程长、充电桩够多、对健康无害	续航里程在以 600KM 上	重要	随时告知, 在新能源汽车研发的各个里程碑, 及时发布用户所关注的信息
8	燃油汽车	传统汽车制造商		竞争者	156……, EMAIL: ……	反对	共同发展	继续保持市场主导地位	一般	密切关注其动态, 还要关注传统汽车的技术革新
……		其他								
