


T-CASE-003 | 范围蔓延、变更失控与合同纠纷案例模板

本专题与 T-CASE-001 和 T-CASE-002 配合使用。提供范围蔓延/变更失控和合同纠纷/索赔两类案例的专项诊断模板。

范围蔓延与变更失控案例模板

典型剧情模式

范围蔓延和变更失控的案例题有高度可识别的"标准剧情"：

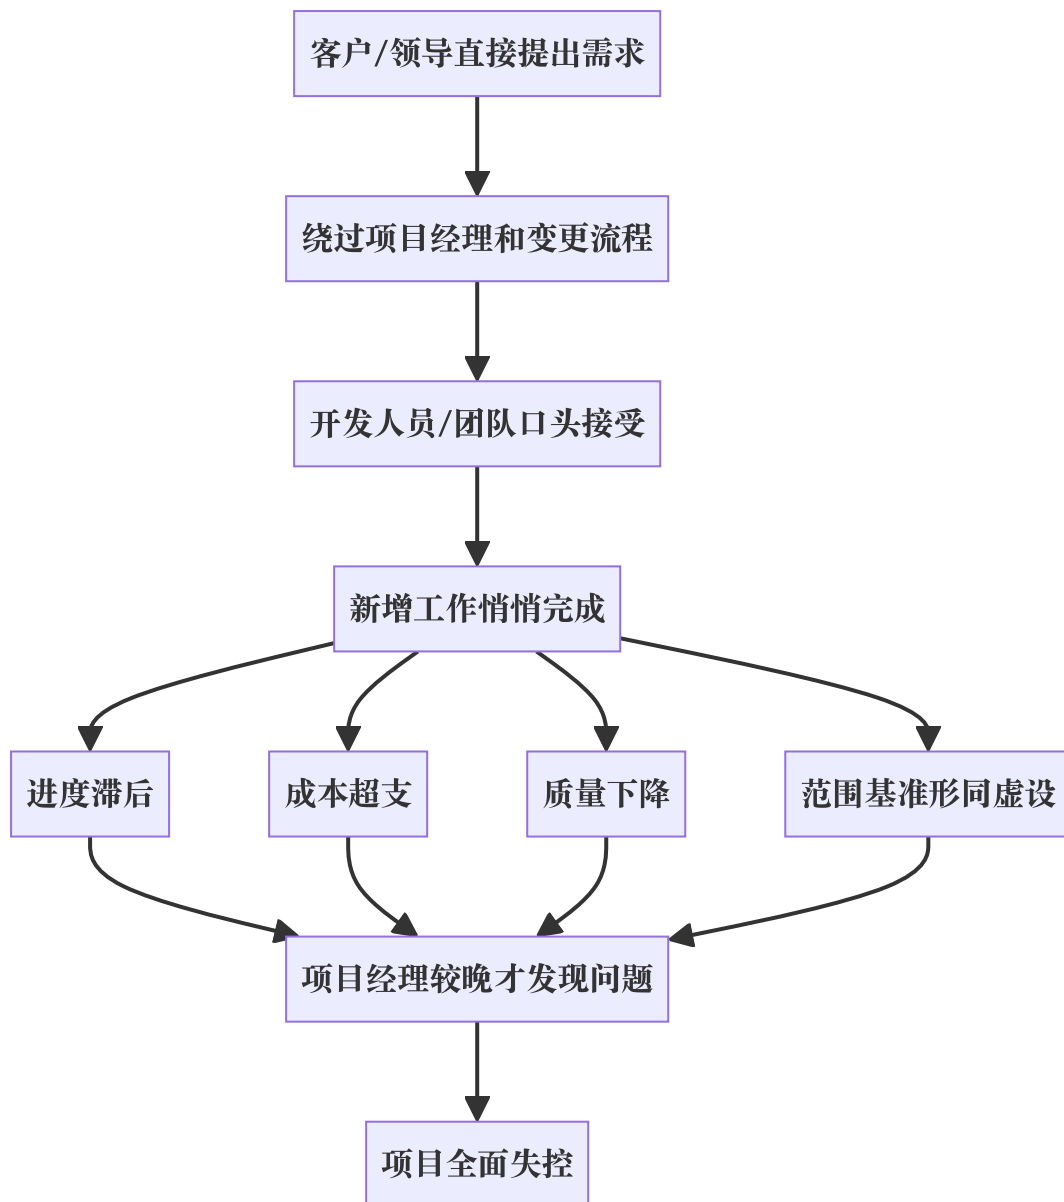

变体识别

剧情变体	关键信号词
客户绕路型	"客户直接联系开发人员"、"口头要求"、"为了维护客户关系"
领导越权型	"领导直接要求"、"高层打招呼"、"没走流程"
团队擅自型	"团队自己决定"、"觉得应该加上"、"没通知PM"
渐进蔓延型	"每次加一点"、"需求不知不觉就变多了"、"回头看才发现"

答题框架（答题得分点）


找问题：① 变更控制流程缺失/形同虚设；② 范围基准未被维护；③ 干系人/客户绕过项目经理；④ PM监控频率不足；⑤ 团队缺乏变更管理意识。

分析原因：① 项目启动时未建立有效的变更控制流程；② 未与客户/干系人就变更路径达成共识（谁可以发起变更、通过什么渠道）；③ WBS 不全/不清晰→范围边界模糊→蔓延容易发生；④ PM未能及时收集工作绩效信息。

提措施：① 立即暂停所有未审批的变更工作→逐项评估影响→补走正式变更流程（CCB审批）→更新基准→通知干系人；② 与客户建立变更管理的单一接口（统一通过PM提交）；③ 对团队进行变更管理意识培训；④ 缩短监控周期。

合同纠纷与采购案例模板

典型剧情模式

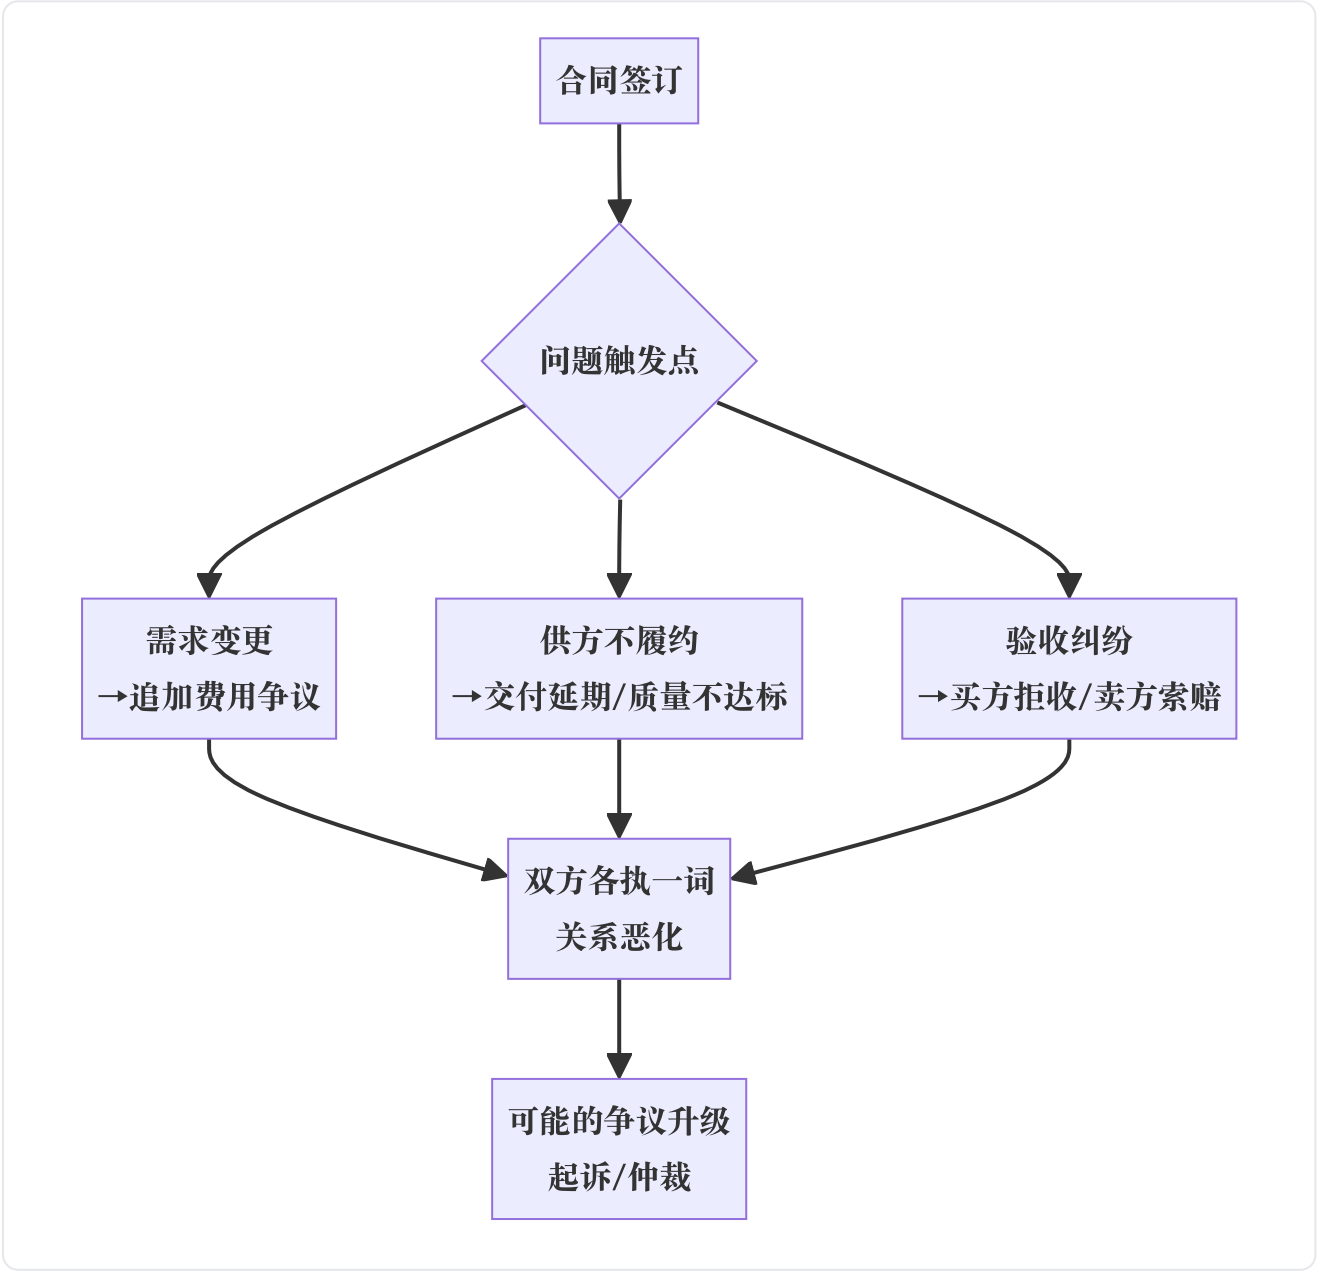

诊断框架

合同类型判断是最先要做的——很多合同纠纷的根源是合同类型与项目特性不匹配：

- 固定总价 + 频繁变更 = 争议黑洞。卖方承担变更成本不合理，买方以为"固定价格 = 所有变更都包含在内"。
- 成本补偿 + 弱管控 = 成本失控。买方对卖方花销几乎无限兜底。

合同纠纷答题模板：

问题类型	诊断要点	措施方向
合同类型不当	需求频繁变更但用了固定总价	评估是否应转工料合同、补签变更协议
变更管理缺失	需求变了但无合同变更流程	建立合同变更控制→评估变更→签补充协议
供方选择不当	技术能力不足、低价中标	评估是否需换供方（考虑中断成本）
验收标准不明	合同未明确验收标准	补充验收标准→记录问题清单→修复后重新验收
索赔管理缺失	发生损失但没有走索赔流程	收集证据→按合同条款提出索赔→协商→调解→仲裁

典型题目训练

变更失控案例

某项目开发过半时，甲方信息中心主任多次直接找开发人员增加报表功能。开发人员为维护客户关系口头答应了。项目经理在周例会上才发现范围严重超限，进度滞后2个月，团队因额外加班出现离职倾向。

即时诊断：变更失控典型剧情（客户绕路型）+团队影响。

答题要点：

- 问题：① 变更无正式流程—客户绕过PM直接对接开发方；② 范围蔓延—新增功能未评估、未审批、未更新基准；③ PM监控失效—例会才暴露说明信息收集滞后；④ 团队风险—额外加班导致离职倾向。
- 措施：① 立即暂停新增功能开发，评估已增部分对范围/进度/成本/质量的影响，补走变更流程；② 与客户建立单一变更接口（所有变更→PM→评估→CCB审批）；③ 与团队沟通当前情况和后续计划，缓解焦虑情绪；④ 重新评估进度，针对性采取补救措施；⑤ 如有必要走整体变更控制更新基准。

合同纠纷案例

某公司以固定总价合同将测试工作外包给第三方。执行中需求发生4次变更，第三方要求追加费用。买方PM认为"固定总价意味着不管怎么变都不加钱"。第三方暂停工作，买方准备起诉。

即时诊断：合同类型认知错误 + 变更管理缺失 + 争议解决路径跳跃。

答题要点：

- 问题：① PM对固定总价合同认知错误—固定总价保障合同范围内工作的价格固定，范围外的变更需另行计价；② 变更管理缺失—需求变更后未走合同变更流程、未签补充协议；③ 争议处理不当—直接跳到起诉，应优先协商或调解。
- 原则：固定总价不是"不管怎么变都包干"，合同范围外的变更需要重新定价→应通过合同变更控制→签署补充协议。

本轮真题覆盖增强：范围蔓延与合同证据链

本节把 `questions.full.clean.md` 与既有真题映射中的高频考法反查回本专题。2019 下午范围案例中，视频聊天网站被客户理解为电子商务核心系统，核心失分点是需求确认、范围说明书、变更控制。学习时不要只背定义，要能从题干信号判断它在考哪一个管理动作或技术边界。

这类题的识别链路可以这样看：



图里的重点是“先定位，再排错”。软考选择题常用绝对化说法、角色越权、流程跳步来制造干扰；下午案例题则把同一个错误包装成多句背景，需要把事实翻译回管理过程。

例题 | 范围蔓延与合同证据链（真题型改编训练题）

客户提出新增核心功能，项目经理发现该功能未写入已签署的范围说明书。较稳妥的处理是：

- A. 立即无偿开发，避免客户不满
- B. 依据范围基准确认偏差，提交变更请求并分析对工期、成本、质量和合同的影响
- C. 让开发人员私下决定是否加班完成
- D. 删除原范围说明书重新开始

考查点：范围蔓延、变更控制、合同附件。

题干关键词：新增核心功能、范围说明书、影响分析。

解题过程：未纳入范围基准的新功能应通过变更流程处理，不能直接变成团队义务。

正确答案：B。

错项分析：

- A 容易形成范围蔓延。
- C 绕过正式授权和影响评估。
- D 破坏基线管理，且不能解决责任边界。

举一反三：范围案例的证据链通常是：需求未澄清-范围说明书未确认-验收标准模糊-变更流程失效-进度/成本失控。

可制卡点：范围说明书内容；范围蔓延 vs 合法变更；合同附件与验收标准。

这个专题应该怎样转化为 Anki 卡片

模板卡：范围蔓延四类剧情模板（客户绕路/领导越权/团队擅自/渐进蔓延）及其标准诊断-措施链。合同纠纷的合同类型判断优先原则。

陷阱卡："固定总价=卖方承担一切变更成本"→错；"变更管理流程=填个表"→错；"合同纠纷=直接起诉"→错（应有协商→调解→仲裁→诉讼的递进路径）。

本专题的最小掌握标准

面对范围蔓延/变更失控案例：能识别剧情模式→按标准诊断清单输出问题→给出"暂停→评估→补流程→更新→沟通"的措施链。面对合同纠纷案例：能先判断合同类型是否匹配→分析变更管理是否缺失→给出争议解决的递进路径。

待核验与后续改进

- 合同纠纷处理中协商/调解/仲裁/诉讼的具体程序性规定需对照相关法规核实。[待核验]
